

tsunami

Vijfde Tussenrapportage SHO actie 'Help slachtoffers aardbeving Azië' (tsunami)

Periode 26 december 2004 – 31 maart 2006

Actie Aardbeving Azië

Van opbrengst naar opbouw



Kijk op www.giro555.nl

Inhoudsopgave

Begrippenlijst	1
Afkortingen	2
Voorwoord	3
1. Inleiding	4
2. De Samenwerkende Hulporganisaties	5
3. Financiële rapportage	7
3.1 Inkomsten en uitgaven van de actie	7
3.2 Ontvangen SHO fondsen en uitgaven per organisatie	8
3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening	10
3.4 De hulpverlening naar sector	11
4. De hulpverlening	12
4.1 Werkwijze van de hulpverlening	12
4.2 Samenwerking	12
4.3 Evaluaties	13
4.4 Voortgang	14
4.5 Knelpunten	14
5. India	16
5.1 Resultaten	16
5.2 De hulpverlening	17
6. Indonesië	18
6.1 Resultaten	18
6.2 De hulpverlening	18
7. Myanmar	20
7.1 Resultaten	20
7.2 De hulpverlening	20
8. Somalië	21
8.1 Resultaten	21
8.2 De hulpverlening	21
9. Sri Lanka	22
9.1 Resultaten	22
9.2 De hulpverlening	22
10. Thailand	24
10.1 Resultaten	24
10.2 De hulpverlening	24
11. Geleerde lessen	25
12. Conclusies	28
Bijlage 1 Financieel overzicht van baten en lasten	29
Bijlage 2 Verdeling van de inkomsten van de actie	31
Bijlage 3 Schema van resultaten en doelgroepen per land per organisatie	32
Bijlage 4 Overzicht gefinancierde Nederlandse project partnerorganisaties	70
Bijlage 5 Overzicht uitvoerende (lokale) organisaties	72
Bijlage 6 Profielen SHO lidorganisaties	78
Bijlage 7 Profielen gastorganisaties	79
Bijlage 8 Contactpersonen	80

Begrippenlijst

Committeringen

De financiële verplichtingen die de gevende organisatie heeft ten opzichte van de uitvoerende organisatie in het getroffen gebied met betrekking tot een project dat de uitvoerende organisatie heeft voorgesteld.

Overmakingen

Bedragen die de gevende organisatie naar de uitvoerende organisatie overboekt voor het gefinancierde project.

Bestedingen

Bedragen die de uitvoerende organisatie voor het gefinancierde project heeft uitgegeven en waarover deze aan de gevende organisatie heeft gerapporteerd.

Resultaten

Beoogde resultaten, te behalen aan het eind van de activiteiten, zijn aan het begin van het project overeengekomen tussen de gevende organisatie en de uitvoerende organisatie; ze zijn beschreven in een projectvoorstel van de uitvoerende organisatie. Tussentijds en na afloop rapporteert de uitvoerende organisatie over wat is bereikt aan resultaten.

Sectoren

Activiteiten in het kader van noodhulp en wederopbouw kunnen worden ingedeeld in sectoren. Het gaat hier om sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid (zie ook bijlage 3).

Monitoring

Het volgen van planning en uitvoering van projecten door de gevende en uitvoerende organisatie met behulp van een van te voren vastgestelde methode of instrument (proces en / of producten).

Afkortingen

ALNAP	Active Learning Network for Accountability
AKV	Apparaatskostenvergoeding
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Indonesië)
BZ	Ministerie van Buitenlandse Zaken
CBO	Community Based Organization
ECE	Early Childhood Education center = 'Kleuterschool'
GAM	separatistische beweging Vrij Atjeh
IDP	Internally Displaced Person = Ontheemde
LTTE	Liberation Tigers of Tamil Eelam
MFI	Micro Finance Institutions = Instellingen die kleine kredieten uitgeven
NGO	Niet Gouvernemente Organisaatie
NFI	Non Food Items = Noodhulpgoederen
OCHA	United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs
OVC	Orphans and Vulnerable Children = Wezen en kwetsbare kinderen
SHO	Samenwerkende Hulporganisaties
TAFREN	Task Force for Rebuilding the Nation (Sri Lanka)
TEC	Tsunami Evaluation Coalition
TLC	Temporary Relocation Centres = Tijdelijke wooncentra
VN	Verenigde Naties

Voorwoord

Voor u ligt de 5e rapportage van de SHO over de tsunami actie. De vorige rapportage telde 70 pagina's, deze 85. Het verschil zit in de lengte van bijlage 3, waarin de organisaties de resultaten van de hulpverlening presenteren. In een half jaar is veel voortgang geboekt. De committeringen en bestedingen zijn substantieel toegenomen, de laatste met 34% ten opzichte van december 2005.

Na de noodhulp is er een periode geweest dat de wederopbouw moest worden voorbereid. In het tweede en derde kwartaal van 2005 werden er relatief weinig nieuwe projecten gestart. Na behoefteonderzoek onder de getroffen bevolking en het oplossen van o.a. grondeigendoms kwesties kon de wederopbouw vanaf oktober pas goed op gang komen. 80% van de verkregen fondsen uit de Nationale Actie is per 31 maart toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouwprojecten. Voor het einde van dit jaar zal dat 100% zijn.

Ook in deze rapportage schrijven we over de uitdagingen die wij in de uitvoering zijn tegenkomen. Niet alles gaat even gemakkelijk. Voor organisaties die vaker met het bijtje van noodhulp hakken, is dat geen verrassing. Bij acute noodhulp staan de neuzen van alle betrokken vaak wel dezelfde kant uit. Iedereen wil mensenlevens redden. 'Iedereen' is soms wel wat veel en coördinatie van noodhulp is moeilijk. Bij wederopbouw komen er weer andere belangen om de hoek kijken. Van de overheid, van particuliere aannemers, van de getroffen bevolking en ook van internationale en lokale hulporganisaties. De wederopbouw is complex en regelgeving speelt een grote rol.

Uit het Nederlandse publiek komen vragen of de hulporganisaties hun geld wel goed besteden. Mensen hebben hoge verwachtingen. Maar de enorme omvang van de ramp en de onvoorstelbare immateriële en materiële schade poets je niet zo maar weg. Bovendien willen we betere levensomstandigheden dan voor de tsunami realiseren. Dat kost tijd, zoals we dat ook herinneren uit onze eigen wederopbouwjaren. Met rapportages als deze en de informatie op de website (www.giro555.nl) willen wij op een transparante manier verantwoording afleggen van onze financiële en inhoudelijke keuzes. Deze zomer brengen de SHO ook nog een jaarrapport met accountantscontrole over 2005 uit.

Soms dreig ik door mijn functie af te dwalen van de mensen om wie het gaat in de hulpverlening na de tsunami. Maar als ik een verhaal lees als dat van Nur Afika (33 jaar) uit het dorpje Lampu Kawat in Atjeh ben ik weer bij de les. Op 26 december vluchtte zij met haar gezin voor het water en een jaar woonde ze in een tent. In februari stapte ze haar nieuwe huis binnen. Het gezin trotseerde de hitte, de muskieten en Nur Afika beviel in de tent van een tweede dochter. Zodra ze de kans kregen, hielpen Nur en haar man Muhammad mee met het bouwen van hun huis. Ze wilden niets liever dan zo snel mogelijk terug naar Lampu Kawat. Daar was het leven altijd goed geweest. Hun huis is klaar en Muhammad, die visser is, heeft een nieuwe boot gekregen.

Bert Boer, voorzitter Samenwerkende Hulporganisaties

1. Inleiding

In deze vijfde tussenrapportage leggen de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) verantwoording af over de bestedingen die zij tussen 26 december 2004 en 31 maart 2006 hebben gedaan ten behoeve van de actie 'Help slachtoffers aardbeving Azië'.

Het rapport is gebaseerd op deelrapportages van 18 Nederlandse organisaties, die rechtstreeks geld hebben ontvangen van de actie voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de tsunami. In de deelrapportages is op voorgeschreven wijze kwantitatieve en kwalitatieve informatie geleverd over de bestedingen, de doelgroepen, de sectoren en de landen. Ze bevatten de geplande en bereikte doelgroepen en resultaten. In deze samenvatting worden alleen de bereikte resultaten en doelgroepen beschreven.

Voor deze rapportage maken de SHO lid- en gastorganisaties gebruik van de rapportages die zij uit het getroffen gebied van hun partnerorganisaties ontvangen. De uitvoerende organisatie legt periodiek verantwoording af over het verloop van de projecten. Iedere SHO lid- en gastorganisatie heeft eigen afspraken gemaakt over de rapportageverplichtingen die zij stelt aan haar partners. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de resultaten van iedere organisatie een verschillende periode kunnen beslaan en dat niet van alle lopende en soms al uitgevoerde projecten de rapportages in deze samenvatting zijn verwerkt. Bij elke volgende tussentijdse rapportage van de SHO kunnen meer resultaten worden gemeld.

De hulpverlening zit nu in de wederopbouwfase. De werkzaamheden voltrekken zich gestaag.



Lachende kinderen op het strand van Atjeh.

Foto: Kerkinactie en ICCO.

2. De Samenwerkende Hulporganisaties

In Nederland werken acht organisaties samen als de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om landelijk fondsen te werven ten behoeve van slachtoffers van grote rampen. De door de SHO bijeengebrachte middelen worden aan de individuele SHO-leden toebedeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze sleutel wordt bepaald aan de hand van de omvang van de reguliere noodhulpprogramma's van de leden en het draagvlak van de lidorganisaties in Nederland.

Bij het begin van de actie is besloten om 10 % van de particuliere inkomsten op giro 555 (van € 204 miljoen) opzij te zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. De gastorganisaties konden bij de SHO een voorstel indienen voor financiering. Tien voorstellen zijn goedgekeurd. Deze omvatten een totaalbedrag van € 15,7 miljoen, wat neerkomt op 8%. De overige 2% is onder de lidorganisaties verdeeld.

Naast de tien gastorganisaties zijn via de permanente lidorganisaties tot nu toe 54 Nederlandse organisaties (zie bijlage 4) gesteund die projecten uitvoeren in het rampgebied. In totaal wordt het geld van de actie door 72 Nederlandse hulporganisaties besteed.

De bijdrage van € 5 miljoen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking is exclusief voor de lidorganisaties bestemd en is gekoppeld aan specifieke projectvoorstellen voor noodhulp. Ook voor de bijdrage van de minister is een verdeelsleutel gebruikt.


De meeste organisaties werken vanuit een geheel omvattend hulpprogramma, dat uit verschillende bronnen gefinancierd wordt. De bijdrage van de actie vormt dan een onderdeel van een groter budget. Voor informatie over het gehele programma van de SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers wordt verwezen naar de websites van de individuele organisaties.

Elk van de SHO-lidorganisaties verleent hulp door het financieren van projecten die haar partnerorganisaties in het rampgebied uitvoeren. In sommige gevallen lopen de bijdragen via een internationale koepel. De uitvoerende organisaties zijn vermeld in bijlage 5.

Traumabegeleiding van slachtoffers in Zuid en Zuidoost Sri Lanka (Terre des Hommes)

Als onderdeel van het uitgebreide wederopbouwprogramma dat de Small Fishers Federation (SFFL) uitvoert in de districten Hambantona, Matara en Ampara, is een mobiele kliniek ingezet voor de behandeling van klachten van traumatische en somatische aard. De bestelwagen omgebouwd tot ambulance, reed langs verschillende opvangkampen en getroffen dorpen om slachtoffers te kunnen bijstaan. Inmiddels is de gezondheidsinfrastructuur weer van dien aard dat de activiteiten van de mobiele kliniek konden worden afgesloten. In de periode dat de kliniek opereerde heeft de medische staf bijna 5.000 somatische patiënten gezien. Daarnaast werden ruim 800 mensen met traumatische klachten bijgestaan. De traumabegeleiding werd in eerste instantie door de medische staf uitgevoerd. In dezelfde periode waren leidende personen in de verschillende vissersgemeenschappen getraind in traumabegeleiding. Deze konden de behandeling en begeleiding verder overnemen van de medische staf van de SFFL.

Figuur 1: SHO-organisaties in de door tsunami getroffen gebieden.

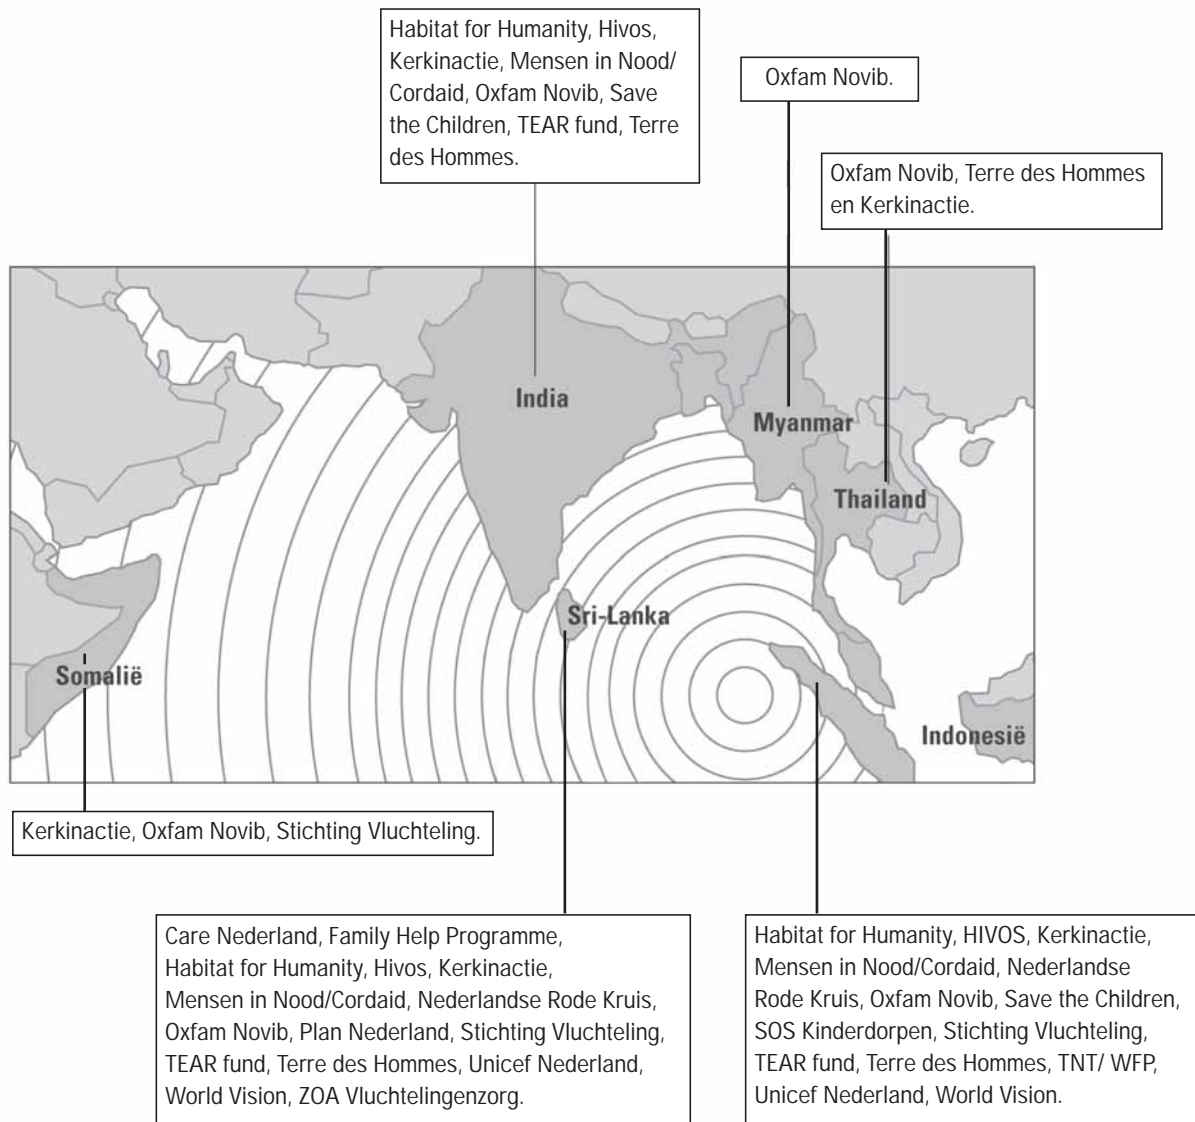

3. Financiële rapportage

3.1 Inkomsten en uitgaven van de SHO

De opbrengsten van de actie bedroegen per 31 maart 2006 ruim € 208 miljoen. Het Nederlandse publiek heeft € 203 miljoen geschonken. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft € 5 miljoen bijgedragen. Op het gironummer van de actie is € 204.311 rente ontvangen. Hieronder staat in een overzicht weergegeven welk deel van de opbrengsten is overgemaakt aan de lid- en gastorganisaties en welk deel bestemd is voor fondsenwerving.

Tabel 1: Staat van baten en lasten t/m 31 maart 2006.

<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	€	
- opbrengsten uit publieksdonaties		203.596.156
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>		
- actie- en administratiekosten		3.646.850
		<hr/>
% van baten eigen fondsenwerving	1,79%	
Beschikbaar uit fondsenwerving		199.949.306
<i>Subsidies van overheden en anderen</i>		
- Ministerie van Buitenlandse Zaken		5.000.000
<i>Rentebaten</i>		204.311
		<hr/>
Totaal beschikbaar voor verdeling		205.153.617
		<hr/>
<i>Verdelingen t/m 31 maart 2006</i>		
- overgemaakt inzake opbrengsten uit publieksdonaties		199.053.500
- overgemaakt inzake donatie Ministerie van Buitenlandse Zaken		5.000.000
		<hr/>
Totaal overgemaakt		204.053.500
		<hr/>
Nog beschikbaar voor verdeling		1.100.117
		<hr/>

Bij het opzetten en uitvoeren van iedere actie worden kosten gemaakt. Hiervoor is op het ontvangen budget een reservering gemaakt van € 3.646.850. De actiekosten bedroegen tot nu toe € 2.181.807. Een reservering is gemaakt om de gevers via rapportages, de tsunami-krant en televisie-uitzendingen inzicht te geven in de besteding van de gelden.

3.2 Ontvangen SHO tsunami fondsen en uitgaven per organisatie

De SHO-(gast)leden werken veelal met partnerorganisaties. Deze partnerorganisaties dienen projectvoorstellen in bij de Nederlandse organisaties voor financiering met SHO-fondsen. Bij goedkeuring gaat de betrokken organisatie een committering aan voor financiering van het voorstel. De bijdragen worden vervolgens, al dan niet in gedeelten, overgemaakt naar de betrokken partnerorganisatie of internationale koepel, dan wel door de organisatie zelf besteed. De partnerorganisaties moeten de ontvangen financiële middelen in overeenstemming met het goedgekeurde projectvoorstel besteden.

Een aantal SHO-(gast)leden maakt deel uit van een internationale koepelorganisatie. Zij dragen met ongeoormerkte bedragen bij aan een groter, overkoepelend programma, waaraan de internationale koepel zich heeft gecommitteerd. Dit is in het bijzonder het geval voor het Nederlandse Rode Kruis en Unicef Nederland. De hoofdkantoren stellen de fondsen beschikbaar aan de veldkantoren en/of de partnerorganisaties die de projecten uitvoeren.

Ten behoeve van de monitoring en de coördinatie van de hulpverlening (ook wel apparaatskostenvergoeding (AKV) genoemd) worden kosten gemaakt door de organisaties vanuit Nederland. Volgens afspraak binnen de SHO mogen die kosten per organisatie niet meer dan 6% bedragen van de ontvangen SHO-gelden. In overeenstemming met de beschikking van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking mogen de apparaatskosten als onderdeel van de € 5 miljoen niet meer dan 3% van dit bedrag beslaan. De bijdrage van de minister is alleen bestemd voor het verlenen van noodhulp. Op het totaal door de organisaties van SHO ontvangen fondsen (€ 204 miljoen) is een reservering gemaakt voor deze apparaatskosten. In de eindrapportage van de tsunami actie zal de werkelijke besteding van de AKV worden weergegeven. Alle kosten die in de getroffen gebieden gemaakt worden voor de uitvoering en coördinatie van de hulp vallen onder de rubriek projectgeld (zie bijlage 1 voor gespecificeerde uitgaven).

De organisaties hebben over de ontvangen SHO fondsen rente gekregen, te weten € 2.494.286. De rente komt geheel ten goede van de hulpverlening. Na aftrek van de maximale AKV-ruimte en optelling van de rente is een totaal bedrag (hierna aangeduid met beschikbare tsunami fondsen) van € 194 miljoen beschikbaar voor projecten in de getroffen gebieden.

Van de beschikbare SHO tsunami fondsen is per 31 maart 2006 € 154,6 miljoen gecommitteerd. Met andere woorden, van de verkregen fondsen is 80% toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouwactiviteiten. Er zijn bij de organisaties nog verschillende projectvoorstellen in behandeling. Deze zullen in het komende kwartaal worden omgezet in committeringen. De nadruk van de committeringen ligt in de wederopbouw (79%). Van het gecommitteerde bedrag van € 154,6 miljoen hebben de SHO lid- en gastorganisaties ruim € 121 miljoen overgemaakt aan partnerorganisaties, internationale koepels, dan wel zelf besteed. Overmakingen aan partnerorganisaties worden zo veel mogelijk gedaan in overeenstemming met het bestedingsritme van de partnerorganisatie. Inmiddels is € 80,1 miljoen (41%) aan noodhulp- en wederopbouwprojecten in de getroffen gebieden besteed en afgerond. De meeste bestedingen zijn in de wederopbouwfase gedaan (67%).

Tabel 2: Financiële stand van zaken SHO lid- en gastorganisaties tot en met 31 maart 2006, inclusief de bijdrage van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.


Organisatie	Beschikbare SHO tsunami fonds (projectgeld)	Committeringen	Overmakingen	Bestedingen
SHO-lidorganisatie				
Mensen in Nood/ Cordaid	37.501.246	23.277.332	13.354.548	9.179.993
Nederlandse Rode Kruis	30.109.948	18.418.646	13.142.750	10.603.008
Kerkinactie	28.533.306	20.698.614	18.062.454	6.588.465
UNICEF	22.602.242	22.602.242	22.602.242	6.901.854
Oxfam Novib	20.629.940	19.751.757	16.279.052	15.131.533
Stichting Vluchteling	16.577.607	12.641.256	10.248.869	8.118.946
Terre des Hommes	12.874.530	12.874.529	12.874.530	12.874.530
TEAR fund	10.597.317	9.495.352	5.541.773	3.135.147
Gastdeelnemers				
Hivos	2.845.296	2.839.178	1.847.077	1.777.486
Habitat for Humanity	2.890.000	2.820.000	1.414.000	934.428
Plan Nederland	2.148.497	2.115.000	1.118.465	1.768.338
ZOA Vluchtelingen ¹	1.927.054	1.927.054	217.113	217.113
Save the Children	1.663.687	1.645.943	1.200.000	781.173
CARE Nederland	1.166.862	1.166.862	1.100.000	652.051
SOS Kinderdorpen	958.609	958.609	540.000	294.808
TNT/ WFP ²	500.000	500.000	500.000	500.000
Family Help Programme	514.626	514.626	514.626	146.076
World Vision	448.178	448.178	448.178	285.835
Totaal	194.488.945	154.645.178	121.005.677	79.890.784

Gedurende het jaar 2005 zijn vooral in het eerste halfjaar committeringen aangegaan (zie figuur 1). De meeste overmakingen hebben in de eerste acht maanden plaatsgevonden. De bestedingen zijn vooral toegenomen aan het einde van het jaar 2005. In de laatste twee maanden zijn de bestedingen met 54% toegenomen ten opzichte van de bestedingen tot en met 31 oktober 2005. In het eerste kwartaal van 2006 zijn de bestedingen met 34% toegenomen ten opzichte van december 2005. Het bestedingsritme varieert, de bestedingen in de noodhulpfase waren minder hoog dan verwacht. De landen konden veelal zelf in voedsel voorzien en epidemieën bleven uit, waardoor minder middelen noodzakelijk waren. In de overgang van noodhulp naar wederopbouw was tijd nodig voor behoefteonderzoek, waar eveneens weinig middelen voor nodig zijn. De grootste uitgaven zullen in de wederopbouw plaatsvinden. De activiteiten in de wederopbouw vinden gefaseerd plaats. In de bouw, bijvoorbeeld, worden op bepaalde momenten hoge uitgaven gepleegd voor de aankoop van grond en bouwmaterialen.

1 ZOA Vluchtelingen zal in 2006 de ontvangen SHO tsunami fondsen aanwenden voor haar activiteiten. De eerste twee fasen van hun programma worden uit andere middelen bekostigd.

2 TNT heeft haar activiteiten afgerond en daarom is bij TNT geen reservering op de AKV gemaakt. TNT heeft geen AKV geclaimd.


Figuur 2: Uitgaven in de verschillende rapportageperiodes (in miljoen €)

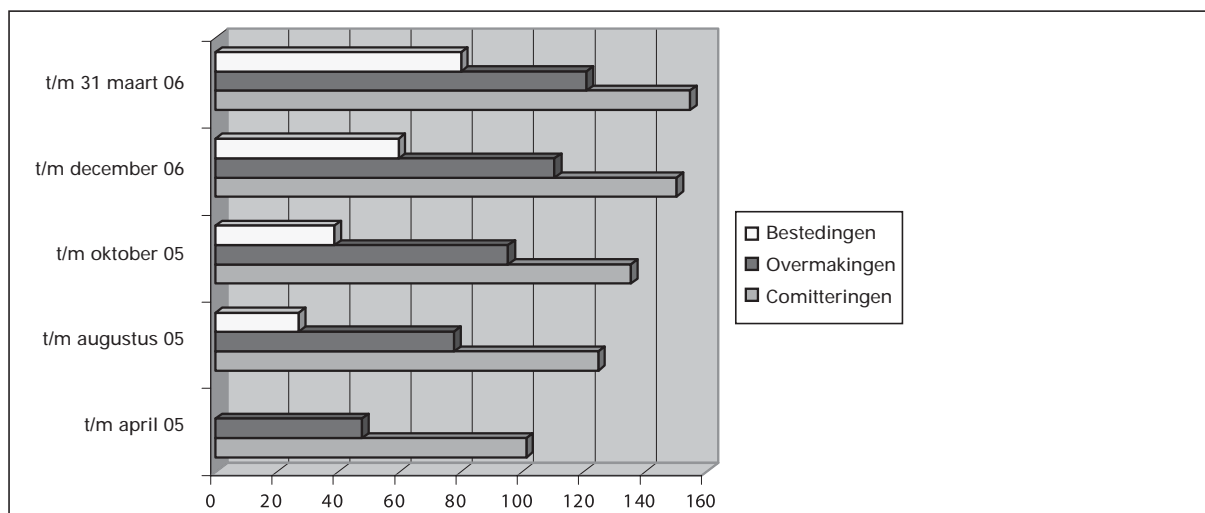


3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening

De hulp na de tsunami is vooral gegeven in Indonesië, Sri Lanka en India. Deze landen waren het zwaarst getroffen door de tsunami. De bijdragen in Myanmar, Somalië en Thailand zijn klein. Hoewel het aantal slachtoffers aanzienlijk was, is de omvang van de SHO hulpverlening in India in verhouding tot Indonesië en Sri Lanka minder hoog geweest. Dat komt doordat de Indiase overheid heeft laten weten, dat zij in staat is de gevolgen van de ramp grotendeels zelf het hoofd te bieden. Het grootste deel van de SHO fondsen is gecommiteerd en besteed aan projecten in Indonesië.

Figuur 3: Committeringen per land per 31 december 2005 (in %).

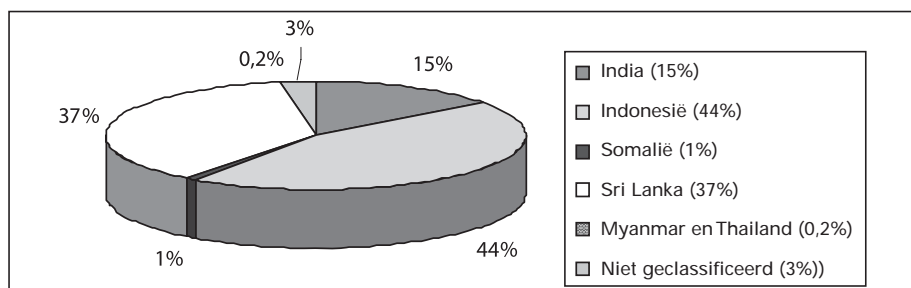

Figuur 4: Bestedingen per land per 31 maart 2005 (in %).

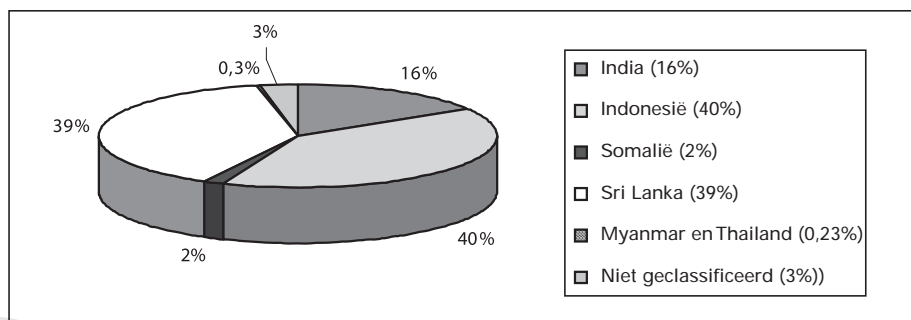


3 De categorie "niet geclassificeerd" is een optelling van de toezeggingen aan Thailand, Myanmar en aan één van de internationale koepelorganisaties waarvan de bedragen niet rechtstreeks aan landen toe te kennen zijn (betreft een organisatie, bij de committeringen en bestedingen gaat het om respectievelijk € 4,1 en € 2,5 miljoen).

3.4 Hulpverlening naar sector


In de noodhulpfase lag de nadruk op de sectoren gezondheidszorg en levensonderhoud. De activiteiten waren bedoeld om in de eerste levensbehoefte te voorzien en allereerst de grootste noden te lenigen. Het ging hier onder andere om het uitdelen van dekens, huishoudelijke artikelen, hygiënepakketten en medicijnen. Daarnaast zijn ook voedselpakketten uitgedeeld en is voor tijdelijk onderdak gezorgd door het leveren van tenten.

Figuur 5: Bestedingen aan de noodhulp per 31 december 2005 (in %).

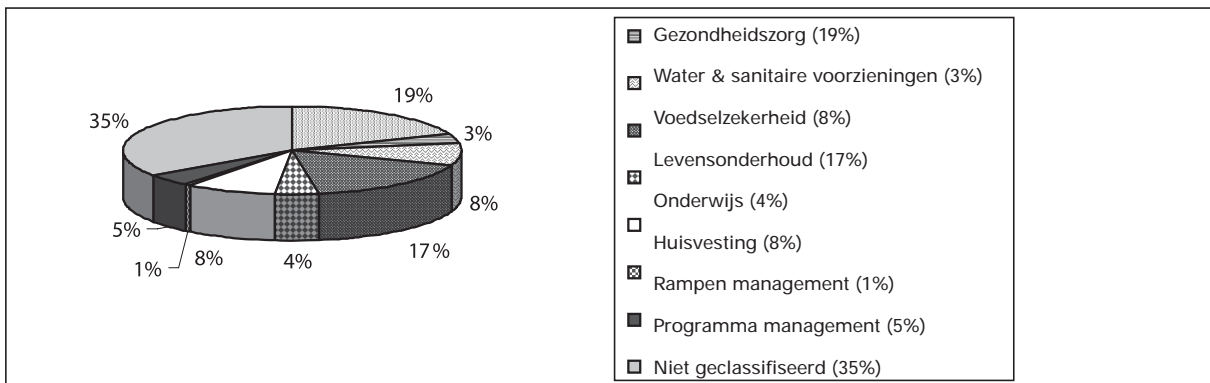

In de wederopbouw is de nadruk komen te liggen op levensonderhoud en huisvesting. De activiteiten in de sector levensonderhoud zijn in toenemende mate gericht op inkomensherstellende activiteiten. In de sector huisvesting gaat het om (semi-) permanente huisvesting. De activiteiten zijn nu meer gericht op herstel van de levenssituatie van vóór de tsunami en er wordt zelfs geprobeerd om deze situatie te verbeteren.

Figuur 6: Bestedingen aan de wederopbouw per 31 december 2005 (in %).

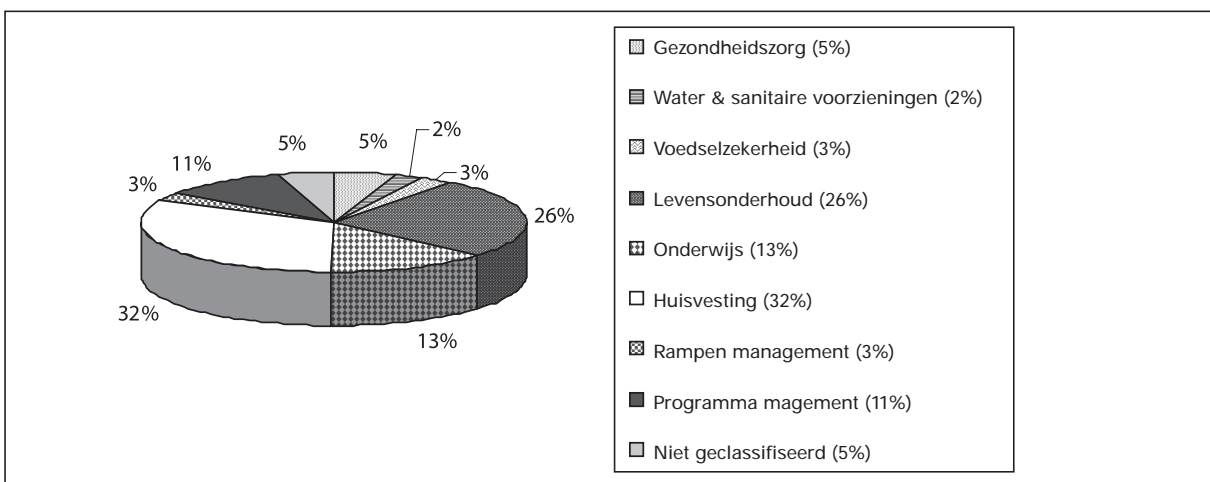

4 De categorie "niet geassocieerd" betreft hier bestedingen via internationale koepels waar de bijdrage een onderdeel is van een geheel programma en niet specifiek is toegewezen aan een bepaalde activiteit en hierdoor niet is weer te geven naar sector (betreft drie organisaties). Daarnaast geeft Cordaid momenteel de besteding nog niet weer naar sector, dit zal zij in de eindrapportage doen. Het gaat in de noodhulpfase om € 9,1 miljoen en in de wederopbouwfase om € 2,5 miljoen.

5 In de landenhoofdstukken is voor de noodhulpfase € 2,5 miljoen buiten beschouwing gebleven. Dit is een toezegging aan één van de internationale koepelorganisaties waar de bijdrage een onderdeel is van een geheel programma en niet specifiek is toegewezen aan een bepaalde activiteit in een bepaalde sector in een bepaald land. In de landenhoofdstukken beïnvloedt dit het beeld van de sector verdeling in geringe mate. Het genoemde bedrag is niet in de categorie "niet geassocieerd" meegenomen; immers het is onbekend hoe de verdeling naar land is van dit bedrag.

4. De hulpverlening

4.1 Werkwijze van de hulpverlening

De SHO-leden en de gastorganisaties onderschrijven de richtlijnen van de 'Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGO's in Disaster Relief'. Dit betekent onder meer dat:

- de hulpverlening gebaseerd moet zijn op werkelijke behoeften,
- de hulp gebaseerd moet zijn op de lokale capaciteit en moet leiden tot versterking van lokale capaciteit,
- de hulp onpartijdig en zonder onderscheid moet zijn,
- de hulp in het culturele patroon van het land moet passen.

Daarnaast hanteren de lidorganisaties het "Do no Harm" principe. Dit betekent dat de hulpverlening geen negatieve gevolgen mag hebben voor de samenleving en haar omgeving. In het verleden is gebleken dat goedbedoelde hulp kan leiden tot bijvoorbeeld een verstoring in het milieu of conflicten.

De partnerorganisaties betrekken zoveel mogelijk de lokale bevolking bij de ontwikkeling van de hulpprogramma's. Veelal waren die partnerorganisaties vóór de tsunami al werkzaam in de getroffen landen.

De fase waarin de hulpverlening verkeert, bepaalt de mogelijkheden die organisaties hebben. In de noodhulpfase is het noodzakelijk om snel tot actie over te gaan. Plannen worden op korte termijn gemaakt en hebben als doel zo snel mogelijk de eerste nood te verlichten. In de wederopbouwfase worden plannen voor de middellange termijn gemaakt. Er kan meer tijd worden genomen om studies te laten uitvoeren naar de lokale context en de behoeften van getroffenen.

4.2 Samenwerking

Vanaf het begin hebben partnerorganisaties samengewerkt met de centrale overheid en lokale autoriteiten in de getroffen landen. In het veld is de coördinatie van de hulpverlening in principe in handen van de lokale overheid. Als een organisatie zich wil inzetten in het getroffen gebied, dient dit eerst aangemeld te worden bij de betreffende autoriteiten. Op allerlei niveaus, nationaal en regionaal, wordt samengewerkt. Er zijn echter grote regionale verschillen; daarnaast hangt de mate van samenwerking met de overheid vaak ook af van personen en goede relaties.

Een land kan voor de coördinatie de hulp inroepen van de Verenigde Naties. De humanitaire organisatie OCHA (= 'United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs') zet zich in Indonesië, Somalië en in beperkte mate in Sri Lanka in om de humanitaire hulp te coördineren.

In Indonesië en Sri Lanka zijn coördinerende overheidsinstanties opgericht. De BRR ('Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi') in Indonesië geeft leiding aan planning en uitvoering en is verantwoordelijk voor de regelgeving. Op provinciaal niveau werkt de BRR bevredigend, echter op districtsniveau is de capaciteit van de BRR beperkt. TAFREN ('Task Force for Rebuilding the Nation') in Sri Lanka is belast met de planning en coördinatie van de projecten in het kader van de tsunami. Op nationaal niveau is er betere aansluiting tussen donoren en de overheid gekomen. TAFREN en de Verenigde Naties hebben een 'donor assistentie database' opgezet. Dit dient als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de activiteiten en plannen van donoren. Niet alle donoren melden echter activiteiten aan, wat de coördinatie en afstemming bemoeilijkt.

tsunami

Naast deze overheidsinitiatieven hebben de NGO's zelf ook actie ondernomen om hun activiteiten te coördineren. Er worden coördinatiebijeenkomsten en speciale sectorbijeenkomsten gehouden. Activiteiten worden toegelicht en afgestemd, de rollen en verantwoordelijkheden besproken en gezamenlijke beleidsbeïnvloedende activiteiten worden afgesproken. De Nederlandse organisaties proberen ook de samenwerking tussen (partner)organisaties te stimuleren en zetten hiertoe adviseurs in om coördinatie-mechanismen op te zetten. De lokale vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in Sri Lanka verzorgt tevens bijeenkomsten met de Nederlandse organisaties in de getroffen gebieden.

Al deze activiteiten moeten de overlap van hulpactiviteiten tot een minimum beperken. Dit wordt niet alleen tijdens het verwezenlijken van activiteiten toegepast, maar ook bij evaluaties.

4.3 Evaluaties

Er is een internationaal initiatief gestart om gezamenlijk te evalueren en niet allemaal aparte evaluaties uit te voeren. De 'Tsunami Evaluation Coalition' (TEC) is hiertoe opgericht. In november 2005 is de SHO onderwerp geweest van een evaluatie naar de Nederlandse NGO financiering voor tsunami noodhulpoperaties. Deze studie vormde één van de zes thematische studies die werden uitgevoerd onder leiding van de 'Tsunami Evaluation Commission'.

De SHO deelnemers en gastdeelnemers hebben ieder een eigen evaluatiesysteem om de efficiëntie, effectiviteit, uitwerking en duurzaamheid van hun tsunami projecten te beoordelen en hieruit geleerde lessen te trekken. Er vinden onder meer projectevaluaties en programma evaluaties plaats, zowel intern als extern. Kwaliteitsstandaarden als de 'Code of Conduct', waaraan de SHO leden zich hebben gecommitteerd, vormen hierin belangrijke indicatoren. Om het interne leren van de SHO te bevorderen zal er in de tweede helft van 2006 een gezamenlijke interne evaluatie plaatsvinden van de programma's gefinancierd uit SHO fondsen. Hieraan nemen zowel de SHO leden als de gastdeelnemers deel.



Huizenbouw op Atjeh.

Foto: Kerkinactie en ICCO (ACT).

4.4 Voortgang

De hulpverlening bevindt zich in de wederopbouwfase. Projecten worden geïmplementeerd en in sommige gevallen afgerond. De vorderingen worden zichtbaar. De huizenbouw heeft een wat moeizame start gehad door problemen met het verkrijgen van bouwgrond. Nu is de bouw in volle gang en worden huizen opgeleverd. Daarnaast worden allerlei activiteiten ondernomen om het normale leven weer zijn beloop te laten krijgen. Mensen kunnen weer in hun eigen inkomen voorzien. Scholen worden gebouwd of hersteld en kinderen worden ondersteund, zodat zij weer naar school kunnen gaan.

De hulpverlening stopt niet bij tastbare hulp zoals huisvesting, ziekenhuizen en scholen. Het gaat ook om immateriële hulp zoals het trainen van ziekenhuispersoneel, voorlichting op het gebied van basishygiëne en beleidsbeïnvloeding. Deze vormen van immateriële hulp zijn noodzakelijk voor de duurzaamheid van de activiteiten in de getroffen gebieden. Als de financiële steun stopt, moeten de projecten een vervolg kunnen krijgen en de resultaten moeten kunnen bekijken.

Ook wordt verder naar de toekomst gekeken door aandacht te geven aan management van rampenbestrijding en 'disaster preparedness' (het voorbereid zijn op rampen).

4.5 Knelpunten

De organisaties ontmoeten verschillende knelpunten. Hieronder volgen een aantal grensoverschrijdende knelpunten, in de volgende hoofdstukken worden de specifieke knelpunten per land aangegeven.

Coördinatie

Het grote aantal organisaties dat in de getroffen gebieden actief was en is, heeft problemen in de coördinatie van de hulpverlening ondervonden. Dit is versterkt door het ontbreken van een sterke overheid in veel van deze landen. Inmiddels is het aantal organisaties verminderd en hebben de regeringen coördinatieorganen opgestart. Daarnaast zijn de NGO's zelf ook uiteenlopende coördinatie-initiatieven begonnen. Dit heeft de situatie verbeterd, maar het aantal organisaties (en particuliere initiatieven) blijft relatief hoog, waardoor de coördinatie lastig blijft.

Capaciteit van lokale organisaties

De tsunami had tot gevolg dat het dagelijkse leven in de getroffen gebieden geheel lam werd gelegd. Dit trof ook de lokale organisaties die de hulpverlening verzorgden. Veel van deze organisaties waren voor de tsunami al partner van de Nederlandse NGO's en beschikten over een beperkte logistiek en administratief apparaat. Deze situatie verslechterde, doordat veel van de eigen medewerkers van de lokale organisaties getroffen waren. Door de grote toestroom van organisaties werd de druk op deze lokale organisaties hoger. Hulporganisaties beconcurrerden elkaar om gekwalificeerde staf. Ze leidden personeel op om te kunnen voorzien in de gestegen behoefte aan arbeidskrachten.

Economische factoren

Het grote aantal organisaties dat actief is in de getroffen gebieden heeft eveneens voor inflatie gezorgd. Er is een grote vraag naar arbeidskrachten en materiaal. Dit heeft prijsstijgingen tot gevolg, waardoor resultaten moeten worden bijgesteld. Er kunnen minder doelen worden bereikt met de oorspronkelijke geplande middelen.

Politiek, sociaal cultureel en geografische factoren

Tijdens verkiezingsperiodes worden door politici beslissingen uitgesteld. Hierdoor aarzelen organisaties om te beginnen met hun activiteiten, immers het beleid kan na de verkiezing worden gewijzigd. Dit gebeurde in Sri Lanka en India. Bepaalde feestdagen en geloofsuitingen hebben ook een vertragend

effect op de hulpverlening. Tijdens de Ramadan, de vastenmaand, liep de voortgang van de activiteiten iets terug. Dit gold voor Indonesië, Somalië en Tamil gebieden in Sri Lanka. De moessontijd heeft ook tot vertraging geleid bij activiteiten in India, Indonesië en Sri Lanka. Tijdelijke onderkomens liepen onder door de hevige regenval en bouw materiaal spoelde weg. De bouw van permanente woningen werd tijdelijk gestaakt.

Bescherming kinderen in India (Save the Children)

Save the Children werkt in Andra Pradesh in India samen met CAMEL. Deze organisatie werkt in 17 afgelegen dorpen waar vissersfamilies wonen die zwaar getroffen zijn door de tsunami. In de dorpen zijn vrijwel geen basisvoorzieningen aanwezig, waardoor de dorpsbewoners bijvoorbeeld enorme afstanden te voet moeten afleggen naar de dichtstbijzijnde school of medische post. Dit maakt vooral kinderen bijzonder kwetsbaar. CAMEL begon snel na de tsunami met een programma om de gemeenschap te helpen kinderen te beschermen en minder kwetsbaar te maken voor misbruik en geweld. Als onderdeel hiervan richtte CAMEL samen met de dorpsgemeenschappen waakzaamheidscomités en kinderclubs op. Doel van de kinderclubs is om kinderen bewust te maken van hun rechten en ze zelf een belangrijke rol te laten spelen in hun eigen bescherming. In het begin kwamen de kinderen alleen bij elkaar om te spelen, maar langzamerhand werden er steeds meer discussies gevoerd. Hierbij werd met name gepraat over hun problemen en nagedacht over een gezamenlijke aanpak.

Financiële onrechtmatigheden

Gedurende de hulpverlening zijn er enkele gevallen geweest waarbij de hulp onrechtmatig is gebruikt. Er zijn begunstigen geweest die onrechtmatig van verschillende organisaties dezelfde hulp ontvingen. Zo is gebleken dat er personen waren die van verschillende hulporganisaties boten ontvingen en deze doorverkochten. Ook kwam het voor dat lokale staf bouwmaterialen doorverkocht, dat aannemers een hogere prijsberekening opgaven en de lokale overheid zich corrupt toonde.

Beschikbare grond

De tsunami heeft het landschap van de getroffen landen totaal veranderd. Land is onder water komen te staan. De golven ten gevolge van de tsunami hebben alles weggevaagd en verwoesting en puin achtergelaten. De grond moest allereerst vrij gemaakt worden van het puin. Dit was heel lastig, omdat de landen niet over materiaal beschikten om dit te kunnen doen. Wanneer de grond vrijgemaakt was, moest achterhaald worden wie de eigenaar was. Het ontbreken van informatie van het kadaster, van officiële documenten van eigendomsrechten, het verdwijnen van referentiekaders van overleden en vermiste personen hebben een vertragende werking gehad op het vrijgeven van grond. Daarnaast zorgde onduidelijkheid in het overheidsbeleid over de bestemmingsplannen voor vertraging. De overheid introduceerde in veel landen een bufferzone langs de kust. De breedte van de bufferzone is meermalen gewijzigd, wat tot onzekerheid leidde en tot verandering van de hulpvraag. Hierdoor konden sommige getroffen mensen terugkeren naar hun oude woonplek en wilden niet meer in aanmerking komen voor hervestiging of andersom.

Continuïteit

Tijdens de noodhulpfase waren veel medewerkers slechts voor een korte periode aanwezig. Hierdoor was relatief veel tijd nodig voor overdracht met gevolgen voor de effectiviteit. De overgang van noodhulp naar wederopbouw vereiste eveneens de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel voor langere termijn. Dit gespecialiseerde personeel was veelal niet direct beschikbaar. In de wederopbouwfase werden arbeidscontracten van langere periodes aangegaan om zo de continuïteit te bewaken.

5. India

5.1 Resultaten

In India zijn acht SHO lid- en gastorganisaties actief. Per 31 maart 2006 zijn de committeringen € 22,7 miljoen en de bestedingen € 12,9 miljoen. De meeste committeringen (81%) en de bestedingen (74%) zijn in de wederopbouwfase gedaan.

De hulpverlening in de noodhulpfase vond vooral plaats in de sectoren levensonderhoud (23%), voedselzekerheid (13%) en huisvesting (10%). Het gaat hier om distributie van noodhulpgoederen zoals kleding, dekens, voedsel en tijdelijk onderdak.

In de wederopbouwfase vindt de hulpverlening vooral plaats in de sector levensonderhoud (55%), gevolgd door onderwijs (12%) en huisvesting (10%). In deze fase is hulp vooral gericht op inkomensgenererende activiteiten, zodat mensen weer zo snel mogelijk in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Het gaat hier bijvoorbeeld om het leveren van boten en visnetten.



Huizenbouw in India.

Foto: Kerkinactie en ICCO.

5.2 De hulpverlening

India is een stabiel land. Dit betekent echter niet dat zich in de hulpverlening geen problemen hebben voorgedaan en nog voordoen.

In het begin was de aandacht vooral gericht op de vissersgemeenschappen. Langzamerhand werd duidelijk dat niet alleen vissers getroffen waren. De NGO's hebben steeds geprobeerd de hulp zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. Het kastensysteem in India geeft belemmeringen voor het bereiken van specifieke groepen in de laagste kasten zoals de Dalits (onaanraakbaren) en andere gemarginaliseerde groepen. Deze groepen worden veelal niet in de door de overheid gehanteerde registratiesystemen opgenomen. De NGO's zijn hier alert op en proberen zoveel mogelijk oog te hebben voor alle slachtoffers. Binnen de vissersgemeenschappen is er verzet om deze groepen te ondersteunen. Ervaring heeft geleerd dat hulp aan gemarginaliseerde groepen mogelijk is wanneer dit gelijktijdig gebeurt met hulpverlening aan de vissersgemeenschappen.

Het grote aantal NGO's dat werkzaam is in India zorgt ervoor dat de overheid een afwachtende houding aanneemt. De NGO's hebben te maken met een bestedingsdruk, waardoor concurrentie om projecten ontstaat tussen organisaties. De overheid hoeft zelf niet veel te ondernemen omdat er genoeg organisaties zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren. Zij stelt land beschikbaar en fungeert als opzichter. De overheid stelde nieuwe richtlijnen op voor de bouw die aanvankelijk veel onduidelijkheden bevatten. Daarnaast geeft zij lijsten met begunstigden uit. Hier is geruime tijd op gewacht en de lijsten blijken niet juist en volledig te zijn. Er is zorg bij de NGO's of de overheid na vertrek van de NGO's de duurzaamheid van de projecten kan garanderen.

De tijdelijke huisvesting is van beperkte kwaliteit. De overheid wilde dat alle slachtoffers voor 15 januari 2005 een dak boven hun hoofd hadden. De verkiezingen die in het verschieft lagen, zorgde voor deze druk. De zittende regering wilde daadkrachtig overkomen. Deze snelle handelswijze heeft er voor gezorgd dat ongeschikte locaties zijn geselecteerd. Door de cycloon langs de oostkust en in de moessontijd zijn de huizen ondergelopen. Daarnaast stelde de overheid de eis dakplaten van teer te gebruiken als dakbedekking in plaats van het traditionele riet. Hiermee nam de brandgevoeligheid van woningen af, maar door de deze platen nam de warmte in de huizen toe.

Behalve het vaste land van India zijn ook de Andaman en Nicobar eilanden getroffen. Door de grote afstand tussen de eilanden en het gebrek aan transportmiddelen, deden zich grote logistieke problemen voor. De communicatie verliep moeizaam, omdat er te weinig elektriciteit was. Daarnaast is er weinig materiaal om puin te ruimen. De aanvoer van transportmiddelen heeft de situatie iets verbeterd.

Een inkomen voor Indiase dalits (TEAR fund)

Een dalitgemeenschap in Petankupam (India) werd niet direct getroffen door de tsunami. Maar de dalits raakten hun werk kwijt omdat ze vrijwel allemaal als arbeider voor vissers uit de kustdorpen werkten. Bovendien ligt het dorp aan de rand van een rivier die als gevolg van de tsunami overstroomde. Veel van de eenvoudige, lemen hutjes raakten vernield.

De bewoners van Petankupam kregen per drie of vier families een eenvoudige boot waarmee ze op de rivier kunnen vissen. Hiermee verdienen ze een redelijk stabiel inkomen en zijn ze van goedkope arbeiders veranderd in booteigenaars. Mensen van wie de huizen door het water waren vernield, hebben nieuwe huizen gekregen. Zo hebben ze niet alleen meer zekerheid voor de toekomst, maar ook meer eigenwaarde gekregen.

6. Indonesië

6.1 Resultaten in de hulpverlening

Veel SHO lid- en gastorganisaties verlenen hulp in Indonesië, veertien organisaties in totaal. De committeringen bedragen € 69,5 miljoen. Het grootste gedeelte van de tsunami fondsen gaat naar Indonesië. De bestedingen lopen hier nog bij achter, € 31,9 miljoen. De meeste committeringen (81%) en bestedingen (65%) zijn in de wederopbouwfase gedaan.

In de noodhulpfase lag de nadruk op de sectoren gezondheidszorg (39%), huisvesting (14%) en levensonderhoud (14%). In Indonesië zijn de meeste slachtoffers gevallen. Het ging hier om activiteiten als het bergen van lichamen, het opzetten van mobiele klinieken en het leveren van medische zorg. Daarnaast zijn huishoudelijke pakketten en tenten verspreid.

In de wederopbouwfase is de nadruk meer komen te liggen op huisvesting (47%) en onderwijs (20%). De verwoesting in Indonesië was enorm en veel mensen beschikten niet meer over een woning. De bouw van woningen vormt daarom een belangrijk onderdeel van de wederopbouw in Indonesië.

6.2 De hulpverlening

De ramp in Indonesië vond plaats in een conflictgebied in Atjeh. Dit bemoeilijkte in de eerste fase van de hulpverlening de werkzaamheden. De aanwezigheid van het Indonesische leger leverde spanningen op. Zowel het leger als de politie hielden de hulpverleners sterk in de gaten. Er moest gewerkt worden via een vergunningen- en passensysteem. Ook bestond de dreiging dat buitenlandse organisaties moesten vertrekken. Hierdoor moesten sommige organisaties hun activiteiten tijdelijk staken.



Naaicursus op Atjeh.

Foto: Kerkinactie en ICCO.

De situatie is sindsdien aanzienlijk verbeterd. Half augustus 2005 is er tussen de separatistische beweging Vrij Atjeh (GAM) en de Indonesische regering een vredesakkoord getekend. GAM-strijders hebben hun wapens ingeleverd en een deel van de Indonesische militairen heeft zich teruggetrokken. Ook de waarnemers van de Verenigde Naties in Atjeh dragen bij aan een verbeterde veiligheid op het eiland. De situatie is drastisch verbeterd, maar de veiligheid is nog niet gegarandeerd. Problemen doen zich voor in de oostelijk gelegen districten, waar meer controle is op de aanwezigheid van hulporganisaties. Het integreren van vredesopbouw activiteiten in de hulpverlening is noodzakelijk. De re-integratie van ex-GAM leden op dorpsniveau brengt spanningen met zich mee. Een goede begeleiding van dit proces is noodzakelijk.

Er wordt een striktere controle op de naleving van de Sharia-wetgeving gevoerd in Atjeh. De zorg bestaat dat internationale hulpverleners vroegtijdig moeten vertrekken.

De hulpverleningsorganisaties bespreken in samenwerking met de overheid en lokale gemeenschappen regelmatig corruptie en zoeken naar oplossingen. De lokale organisaties voeren een strikt beleid met betrekking tot deze corruptie en stellen voorwaarden om de wederopbouw op legale wijze te kunnen uitvoeren. Coördinatie en uitvoering van beleid moeten door alle hulpverleningsorganisaties onderschreven worden en daadwerkelijk worden toegepast. De BRR speelt hier ook een belangrijke rol in.

Onlangs zijn onrechtmatigheden bij projecten van diverse organisaties aan het licht gekomen. De organisaties hebben de activiteiten meteen stop gezet en er wordt onderzoek verricht naar de toedracht. De BRR is ingelicht. Nieuwe procedures worden geformuleerd en nieuw personeel wordt ingezet om herhaling te voorkomen.

Recent zijn de BRR en de overheid begonnen met de rekrutering van 12.000 overheidsstafleden en ongeveer 1.200 BRR stafleden. Dit heeft gevolgen voor de hulporganisaties, die velen van hun gekwalificeerde mensen zien vertrekken naar de overheid.

De verwoesting van de tsunami in Indonesië had een enorme omvang. Infrastructuur en communicatiemiddelen waren weggevaagd. Dit leidde tot logistieke en coördinatieproblemen, waardoor de distributie van noodhulpgoederen moeizaam verliep. De coördinatieproblemen werden eveneens vergroot door het grote aantal NGO's dat aanwezig was. In Atjeh waren op het hoogtepunt ongeveer 400 organisaties actief. Inmiddels is het aantal organisaties in Atjeh afgenomen, wat de coördinatie iets vergemakkelijkt. Er zijn echter nog steeds zo'n 300 organisaties. De organisaties houden rekening met de vertragende werking van de slechte infrastructuur. Goederen worden tijdig besteld. Toch zijn er verschillen opgetreden in de vordering van de hulpverlening. In moeilijk bereikbare gebieden ten zuiden van Lhokseumawe en op het eiland Nias verlopen de ontwikkelingen moeizaam.

In de eerste periode na de ramp waren materialen schaars en de prijzen hoog. Hout was moeilijk verkrijgbaar en er is een tekort aan gecertificeerd hout. Een gevaar is dat illegaal gekapt hout wordt gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk materiaal van buiten Atjeh gehaald om het gebrek aan materiaal op te lossen. De overheid heeft echter haar importprocedures niet versoepeld. Alternatieve bouwmaterialen worden ingezet in plaats van hout bij de huizenbouw en op deze manier kunnen de hoge prijzen worden gedrukt. Maar het brengt vertraging van de projecten met zich mee.

Huizenbouw op eiland Nias (Nederlandse Rode Kruis)

Op het Indonesische eiland Nias bouwt het Nederlandse Rode Kruis huizen en scholen. Omdat er op het eiland geen bouwbedrijven zijn, leidt het Rode Kruis de bewoners op om zelf mee te kunnen bouwen aan de huizen. De huizen worden zo gebouwd, dat ze aardbevingbestendig zijn. Het Rode Kruis gebruikt duurzaam hout omdat dit beter is voor behoud van oerwouden. Mensen op Nias willen in de bergen wonen en dat betekent dat bouwmaterialen flink verslept moeten worden. Soms duurt het wel twee uur om materiaal naar boven te krijgen. De eerste twintig huizen zijn bijna af. In de nieuwe dorpen legt het Rode Kruis drinkwatervoorzieningen aan, geeft de organisatie voorlichting over eerste hulp komen er goede sanitaire voorzieningen.

7. Myanmar

7.1 Resultaten

In Myanmar is slechts één organisatie actief. Die organisatie heeft alleen noodhulp geleverd. De schade in Myanmar bleef beperkt. Zowel de committeringen als bestedingen bedragen € 13.065. De hulpverlening vond voornamelijk plaats in de sectoren levensonderhoud, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Het betrof activiteiten om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.

7.2 De hulpverlening

De toegang tot het rampgebied in Myanmar was moeilijk. Dit heeft te maken met het totalitaire regime dat aan de macht is. De militaire junta controleert alles en reizen voor buitenlanders wordt belemmerd. De organisatie die in Myanmar actief was, werkte via lokale organisaties die hulpverlening in de noodhulpfase mogelijk maakten. De verwoesting bleef in Myanmar beperkt, waardoor alleen direct na de ramp hulp nodig was.

8. Somalië

8.1 Resultaten

In Somalië zijn drie organisaties actief. De committeringen en bestedingen zijn € 1,2 miljoen. Het grootste deel van de committeringen is aangegaan voor de wederopbouwfase (54%). De bestedingen zijn tot nu toe vooral in de noodhulpfase gedaan (53%).

De hulpverlening in de noodhulpfaseix vond plaats in de sector gezondheidszorg (59%), gevolgd door voedselzekerheid (17%) en huisvesting (12%). Het betreft activiteiten om de eerste noden te lenigen zoals transport en verspreiding van voedselpakketten en materialen voor onderdak.

In de wederopbouw worden de bestedingen vooral gedaan in de sectoren levensonderhoud (50%), water en sanitaire voorzieningen (24%) en programmamanagement (22%). De activiteiten beslaan trainingen, het leveren van boten, het boren van waterputten en het bieden van ondersteuning aan partnerorganisaties.

8.2 De hulpverlening

De Somalische maatschappij is opgebouwd uit clans. Het ontbreken van een centrale overheid, de armoede en de beperkte infrastructuur maken het werken in Somalië moeilijk. Organisaties moeten opereren in een onzekere veiligheidssituatie. Het is moeilijk om medewerkers te vinden. Om in een afgelegen en riskant gebied te werken, wil men namelijk een hoog salaris hebben. Het overmaken van geld naar partnerorganisaties in Somalië verliep moeizaam. Sinds 11 september 2001 worden Somalische organisaties door banken geboycot. Dit zorgde voor enig oponthoud in de hulpverlening.

De mensen in de getroffen kuststreek zijn feitelijk slachtoffer van drie rampen: het slepende conflict tussen verschillende clans, de aanhoudende droogte en daarna nog eens de tsunami. Om het principe van 'Do no Harm' te kunnen hanteren, wordt de hulp niet alleen beperkt tot de directe tsunami slachtoffers.

Dammen aanleggen in Somalië (Oxfam novib)

Een brede en diepe geul bij de stad Bender Beyla werd door het water van de tsunami sterk verbreed waardoor huizen in de geul dreigen te verdwijnen. De tsunami verergerde een natuurlijk proces van verbreding als gevolg van hevige neerslag, sterke winden en bodemerosie. Vier soorten lokaal aangepaste dammen zijn ontworpen en gebouwd om de stroomsnelheid van het water te beperken en bodemerosie tegen te gaan. 260 arbeiders werden ingeschakeld en het project heeft bijgedragen aan de economie van Bender Beyla. Het karwei is nog niet klaar. Nog meer dammen moeten worden aangelegd om de verbreding definitief in te tomen. Toch heeft het project al goede resultaten bereikt. Door de economische injectie kunnen mensen sparen en schulden aflossen. Hun koopkracht is verbeterd. Een onverwachts effect is ook dat de werkzaamheden hebben bijgedragen aan een betere relatie tussen clans.

9. Sri Lanka

9.1 Resultaten

In Sri Lanka zijn vijftien SHO lid- en gastorganisaties actief. Van de fondsen is € 56,6 miljoen gecommitteerd en € 31,1 miljoen besteed. Zowel de committeringen (83%) als de bestedingen (72%) zijn vooral in de wederopbouwfase gedaan.

Verschillende sectoren worden ondersteund met de beschikbaar gestelde fondsen. In de noodhulpfase waren de meeste bestedingen in de sectoren levensonderhoud (24%) en onderwijs (11%). Het ging hier om het uitdelen van noodhulpgoederen zoals kleding, dekens, diverse huishoudelijke artikelen, het leveren van onderwijsmateriaal en de reparatie van boten. De activiteiten waren er op gericht om in de eerste nood te voorzien. Mensen moesten zo snel mogelijk weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en een onderwijsachterstand bij kinderen moest worden beperkt.

In de wederopbouwfase vindt de hulpverlening vooral plaats in de sector levensonderhoud (31%) en huisvesting (28%). In deze fase is veel hulp gericht op inkomensgenererende activiteiten zodat mensen weer zo snel mogelijk in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Het gaat hier om het leveren van boten, visnetten, productiemiddelen voor de landbouw, naaimachines en het geven van beroeps-trainingen. Daarnaast is de bouw van woningen in volle gang.

9.2 De hulpverlening

In Sri Lanka is een etnisch conflict tussen Singalesen en Sri Lankaanse Tamils. Sinds 1983 is er af en aan een burgeroorlog gaande. Uiteindelijk werd er in 2002 een staakt-het-vuren getekend. Het gebied blijft echter conflictgevoelig.

De tsunami heeft de bevolkingsgroepen wat nader tot elkaar gebracht. De regering en Tamil Tijgers hebben gezamenlijke structuren opgezet, zodat alle tsunami slachtoffers geholpen konden worden. De spanningen namen echter in 2005 weer toe en werden versterkt door de verkiezingen. De nieuwe president Rajapakse is een voorstander van een harde opstelling ten opzichte van de Tamil Tijgers. Mede hierdoor laaide eind 2005 het geweld weer op en was er angst voor het opnieuw uitbreken van een oorlog. Eind februari 2006 zijn de vredesbesprekingen hervat, echter in april 2006 is de LTTE uit de vredesonderhandelingen gestapt. Een bomaanslag op de hoogste legercommandant in Colombo verslechterde de situatie. De spanningen zijn opgelopen en er is vrees voor oorlog.

De situatie in Sri Lanka is instabiel en fragiel. De hulpverlening wordt belemmerd door demonstraties, stakingen, losgeraakte mijnen en lange wachttijden bij de grensgebieden. Dit heeft tot vertraging in de projectuitvoering geleid. Om etnische problemen het hoofd te kunnen bieden coördineren hulpverleners hun werkzaamheden zowel met de regering als met de Tamil Tijgers. Dat kost meer tijd. Het is moeilijk om doelgroepen in de gecontroleerde gebieden van de Tamil Tijgers te laten deelnemen in de planning en besluitvorming. Om conflicten te voorkomen worden niet alleen direct door de tsunami getroffen, maar ook groepen die indirect de gevolgen hiervan ondervinden, geholpen.

De kosten van uitvoering zijn gestegen in Tamilgebieden. Bij de checkpoints moeten ingevoerde goederen in- en uitgeladen worden. In een aantal gevallen zijn speciale vergunningen nodig. Een recente ontwikkeling is dat LTTE autoriteiten Tamil vrouwen ontmoedigen om met internationale organisaties te werken. Verwacht wordt dat hierdoor het personeelstekort zal toenemen. Een ander probleem is dat teams die uit

tsunami



Een nieuwe school voor kinderen in Sri Lanka.

Foto: Kerkinactie en ICCO.

Tamils bestaan, niet in de door de regering gecontroleerde gebieden mogen werken. Dit is veroorzaakt door het oploeiende conflict tussen de regering en LTTE. Daarom moet een speciaal team gerekruteerd en opgeleid worden.

Noodplannen worden opgesteld voor het geval de regulier geplande activiteiten geen doorgang kunnen hebben door het conflict. Ook de veiligheid van het personeel wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Veiligheid- en evacuatieplannen zijn ontwikkeld.

Radio-onderwijs voor kinderen (Plan Nederland)

Naar aanleiding van een onderzoek naar de psychosociale behoeften van kinderen in Sri Lanka, is Plan van oktober tot en met december 2005 begonnen met het "Radio Tuition Project". Dit project had tot doel om scholieren, die als gevolg van de tsunami een onderwijsachterstand hadden opgelopen, te helpen hun eindejaarsexamens (O-levels) te halen. Via de radio werden iedere avond tussen 6 en 7 bijspijkerlessen uitgezonden op het gebied van Engelse taalbeheersing, rekenen/wiskunde en scheikunde. De lessen werden afgewisseld met berichten over kinderrechten en kinderbescherming, thema's die ook tijdens de lessen zelf aangesneden worden. Na een interne evaluatie werd besloten dit project uit te breiden met lessen in het Tamil zodat scholieren in de noordelijke gebieden ook profijt hebben.

10. Thailand

10.1 Resultaten in de hulpverlening

In Thailand zijn drie organisaties actief. Er is voor € 332.451 gecommitteerd en voor € 148.924 besteed. Deze bedragen zijn minder hoog dan in de andere getroffen landen. De schade in Thailand was beperkt en de Thaise regering gaf te kennen zelf goed voor de getroffenenen te kunnen zorgen.

Zowel in de noodhulp- als wederopbouwfase zitten de committeringen op gelijk niveau. De bestedingen zijn vooral in de noodhulpfase gedaan. Veel hulpverlening was gericht op de sector voedselzekerheid (46%). In de wederopbouwfase vinden veel bestedingen in de sector programmamanagement plaats.

10.2 De hulpverlening

In Thailand begon de regering snel met de hulpverlening aan de slachtoffers. Zij sloot de migranten uit Myanmar hiervan uit. NGO's namen deze taak op zich. De economische migranten uit Myanmar zijn veelal illegaal in Thailand en kunnen daardoor geen aanspraak maken op de hulp. Onder de Birmese migranten is grote angst dat zij uitgezet worden; dit is ook in verschillende gevallen gebeurd. Het opstellen van een lijst van vermisten en de identificatie van omgekomen migranten bleek niet gemakkelijk. Veel migranten zijn bang om de bureaucratische procedures te doorlopen.

Het was aanvankelijk moeilijk om ter plaatse een goed opgeleide en ervaren staf te vinden. In het begin richtten organisaties zich vaak op één kwestie, bijvoorbeeld de voorziening van een huis. Hierdoor kwamen andere vragen niet aan bod en was er geen aandacht voor traumaverwerking.

Er worden waarschuwingssystemen opgezet door de Thaise regering, deze moeten nog in het Birmees worden vertaald. Migrantten ontwikkelen nu zelf een waarschuwingssysteem in de gemeenschap in het bijzonder gericht op evacuatie.

11. Geleerde lessen

Tijdens de hulpverlening worden ervaringen opgedaan en lessen geleerd. Een aantal worden hier op een rij gezet.

Coördinatie

Het is gebleken dat coördinatie tussen lokale autoriteiten, andere overheidsorganen, internationale organisaties en lokale organisaties van groot belang is om activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren. Het opzetten van coördinatiecentra heeft de samenwerking tussen verschillende instanties verbeterd. Coördinatiemechanismen dienen een sterkere rol te krijgen en sneller geïnitieerd en/of ondersteund te worden. Dit betekent dat tijd van lokale staf of consultants hiervoor gereserveerd dient te worden. De keerzijde is dat al die coördinatiemechanismen een eigen dynamiek hebben en de processen vertragen.

Sociaal culturele context

Ondanks ervaringen in andere noodhulpgebieden is ook hier gebleken dat het nodig is om kennis van de lokale context te hebben. Dit is vooral van belang in conflictgevoelige gebieden. De SHO lidorganisaties en gastdeelnemers zijn zich bewust van verschillende etnische gemeenschappen en het belang van een gelijke behandeling. Het selecteren van mensen voor een project moet zorgvuldig gebeuren. Spanningen worden voorkomen door gelijktijdig voor verschillende groepen activiteiten te organiseren.

Do no Harm principe

Het "Do no Harm" principe betekent dat de hulp geen schade berokkent aan de samenleving. Bij de hulpverlening in de door de tsunami getroffen gebieden ging het "Do no Harm" principe niet altijd op. In Sri Lanka werd aanvankelijk te veel aangenomen dat de vissers de zwaarst getroffen groep waren. Hierdoor hebben veel organisaties in het begin boten gegeven. Nu blijkt dat hierdoor de 'markt' verzadigd is geraakt. Sommige mensen hebben ten onrechte boten ontvangen en niet alle boten waren geschikt. Natuurlijk zijn de vissers getroffen door de ramp, maar er is te weinig gekeken naar wat nu echt de lokale behoeften zijn. Toen dat duidelijk was, hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers hun strategie aangepast. De organisaties nemen meer tijd voor analyse van de lokale behoefte van getroffenen. Bij inkomensgenererende activiteiten wordt meer aandacht besteed aan marktanalyse en onderzoek naar de productieketen.

Begunstigden

Er zijn gevallen geweest waar hulp geclaimd werd door mensen die geen slachtoffer van de tsunami bleken. Om misbruik van noodhulp te voorkomen heeft een aantal SHO organisaties specifieke mechanismen toegepast. Door bijvoorbeeld te werken met lokale administratieve comités, het nemen van steekproeven en het afnemen van vaardigheidstesten. De eerste behoefteonderzoeken die gedaan werden in de noodhulpfase moeten verbeterd worden in kwaliteit. Verder is consequente en snelle opvolging van aanvullende, specialistische onderzoeken nodig.

Het is van belang om een betere 'gender' balans (man-vrouwverhoudingen) na te streven in de wederopbouw. In gelijke mate deelname van mannen en vrouwen aan identificatie, planning en uitvoering van wederopbouwactiviteiten is belangrijk. De organisaties besteden speciaal aandacht aan 'gender' onderwerpen en 'gender' specialisten werden aangesteld. Eveneens wordt actief gezocht naar vergeten groepen tsunami slachtoffers, zodat de hulpverlening niet alleen bij beter bedeelde en beter georganiseerde groepen terechtkomt. Zo worden verslechtering en verscherping van tegenstellingen voorkomen.

Opleidingen psychiatrie op Sri Lanka (Stichting Vluchteling)

Sri Lanka staat bekend om het hoge aantal psychiatrische problemen: alcoholisme, huiselijk geweld en hoge aantallen zelfmoorden. Desondanks zijn er in het land weinig mensen die opgeleid zijn in de psychosociale hulpverlening. Door de tsunami zijn er nog meer mensen gekomen die psychische begeleiding nodig hebben. Onze partnerorganisatie IMC verzorgt trainingen voor artsen en gezondheidswerkers over psychiatrische problematiek. Een van de trainees vertelt dat hij in zijn praktijk psychische problemen nu al beter kan diagnosticeren en behandelen. Zo bracht een moeder haar kind voor vaccinatie. De arts vroeg haar of zij meer kinderen had. Hierop barstte de moeder in tranen uit en vertelde dat zij haar andere zoon in de tsunami had verloren. De vrouw bleek zwaar depressief en kon nauwelijks normaal functioneren. Met aandacht en medicijnen was haar situatie een aantal weken later drastisch verbeterd.

Financiële onrechtmatigheden

Om financiële onrechtmatigheden te voorkomen zijn verschillende maatregelen getroffen. Met de lokale overheid worden 'Memoranda of Understanding' opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd om corruptie tegen te gaan. Daarnaast stellen de organisaties procedures op om de kans op fraude zo klein mogelijk te maken. Wanneer bij activiteiten grote hoeveelheden materiaal noodzakelijk zijn, wordt een logistiek medewerker aangetrokken om het aankoopproces in goede banen te leiden.

Flexibiliteit in projectimplementatie

Flexibiliteit van toegewezen fondsen is nodig omdat de omstandigheden kunnen veranderen. Dit kan worden veroorzaakt door de veranderde veiligheidssituatie, gewijzigd overheidsbeleid of veranderde behoeften bij de getroffen gemeenschappen. In Indonesië hebben bijvoorbeeld de conflicten plaatsgemaakt voor een vredessituatie. Dit heeft geleid tot een grote behoefte aan vredesactiviteiten. Het grote aantal organisaties dat in de getroffen gebieden werkt, veroorzaakt competitie. Dit kan er toe leiden dat organisaties hun geplande activiteiten moeten wijzigen, omdat een andere organisatie de hulp al levert. Projectvoorstellen moeten gezien worden als een uitgangspunt voor de hulpverlening waarbinnen ruimte is voor bijsturing.

De SHO heeft de termijn van de tsunami-actie op twee jaar gesteld. Echter de tsunami ramp is van zo'n grote omvang dat de verwachting is dat organisaties langere tijd nodig hebben. Er is een mogelijkheid tot verlenging met een derde jaar. Veel organisaties in het getroffen gebied hebben van verschillende donoren geld ontvangen die in de noodhulpfase moest worden besteed. Mede hierdoor worden de SHO middelen vooral in de wederopbouw ingezet. Deze flexibiliteit heeft er toe geleid dat in de eerste fase van de hulpverlening de bestedingen minder hoog lagen.

Op prijsstijgingen en marktwerking dient ook geanticipeerd te worden. Het tijdig transporteren van goederen naar gebieden waar activiteiten plaatsvinden, kan kostenbesparingen met zich meebrengen. Gebruik van alternatieve materialen en het produceren van eigen materiaal door getroffen en kan ook een oplossing zijn. Evenals het opleiden van vakbekwame personen.

Lange termijn visie

Bij de bouw van tijdelijke huisvesting dient rekening te worden gehouden met het feit dat gezinnen hier gedurende een langere periode (twee jaar) moeten kunnen verblijven. Zoals bij zoveel rampen bestond ook hier de verwachting dat permanente huisvesting spoedig zou volgen. Deze verwachting werd niet bewaarheid. Een lange termijn visie is nodig voor rehabilitatieprogramma's. Het is belangrijk voorzichtig om te gaan met activiteiten in de sector levensonderhoud om duurzaamheid te waarborgen. Lokale partners hebben behoefte aan een lange termijn visie en strategie van rampenbestrijding en rampenmanagement.

tsunami



Moeder en kindzorg in Atjeh.

Foto: SHO.

Materiële en immateriële hulpverlening

Er moet niet alleen ingezet worden op materiële hulpverlening (zoals boten, huizen, goederen), maar ook op immateriële belangenbehartiging (zoals rechtshulp, informatie aan slachtoffers en coördinatie). Een combinatie van beide zorgt voor een versterkende werking.

Verantwoording naar de doelgroep toe

Hoewel verantwoording en transparantie richting donoren belangrijk zijn en er (terecht) veel aandacht voor is, wordt verantwoording naar de doelgroep soms vergeten. Het is noodzakelijk dat de doelgroep op de hoogte is van de agenda van lokale organisaties en donoren. Mechanismen moeten worden ontwikkeld die ruimte geven aan de doelgroep om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De moeilijkheid hierbij is dat er veel verschillende (vaak ook politieke) belangen ter plaatse zijn.

Conclusies

Vijftien maanden na de Tsunami is de wederopbouwfase in volle gang. Projecten worden uitgevoerd en afgerond. De vorderingen zijn zichtbaar.

Tussen 26 december 2004 en 31 maart 2006 is een bedrag van € 154.695.178 gecommiteerd. Dit is 80% van de beschikbare tsunami fondsen. In totaal is € 121.005.677 overgemaakt, waarvan € 80.135.976 is besteed. Dit is 41 % van de beschikbare fondsen. Het bestedingsritme varieert, de activiteiten in de wederopbouw vinden gefaseerd plaats. De bestedingen zijn in vergelijking met december 2005 met 34% toegenomen. Van de bestedingen sinds 26 december 2004 is inmiddels 67% gedaan voor de wederopbouw en 33% voor noodhulp.

De nadruk in de hulpverlening ligt op Indonesië waar 44% van de beschikbare fondsen zijn gecommiteerd, gevolgd door Sri Lanka (37%) en India (15%). Voor de bestedingen is dat in Indonesië 40%, in Sri Lanka 39% en in India 16% gedaan.

Een exacte indicatie van het bereikte aantal slachtoffers is lastig te geven. Een simpele optelling van de aantallen zou leiden tot een niet realistische inschatting. Mede gelet op de onvermijdelijke dubbeltellingen (dezelfde mensen krijgen diverse vormen van hulp van meerdere organisaties) lijkt een schatting van om en nabij drie miljoen bereikte mensen redelijk.

In de wederopbouw heeft de hulpverlening zich in het bijzonder gericht op de sectoren huisvesting (32%) en levensonderhoud (26%). De activiteiten zijn gericht op herstel van de levenssituatie van vóór de tsunami. Er wordt gestreefd naar wederopbouw plus, dat wil zeggen naar een situatie die beter is dan die voor de tsunami. Het gaat om (semi-) permanente huisvesting en inkomensherstellende activiteiten.

Tijdens de uitvoering van de hulpverleningsactiviteiten in de getroffen gebieden zijn de organisaties tegen verschillende problemen aangelopen. De omvang van de ramp en de reactie daarop hebben geleid tot coördinatieproblemen. Onduidelijkheden deden zich voor in het overheidsbeleid van de getroffen landen vooral ten aanzien van wet- en regelgeving in de bouw. Daarnaast waren er knelpunten door de conflictsituatie in de getroffen gebieden (Indonesië en Sri Lanka) en door het ontbreken van infrastructuur als gevolg van de ramp (Indonesië, India). Politieke, culturele en geografische aspecten zijn ook van invloed geweest op de projectuitvoering. Deze aspecten hebben een voortvarende aanpak van de wederopbouw in de weg gestaan en heeft geleid tot vertragingen en wijzigingen in de projectplanning.

De organisaties proberen steeds meer te anticiperen op de problemen en hebben knelpunten aangepakt. Er zijn allerlei inspanningen gedaan om de coördinatie te verbeteren. Echter het grote aantal organisaties dat in de landen actief is, maakt coördinatie in ieder geval moeilijk. Er wordt nauw samengewerkt met de overheid om druk uit te oefenen en zo vaart achter plannen te zetten en eventueel bij te kunnen sturen. Het blijft lastig om in conflictsituaties te opereren, er wordt zoveel mogelijk aan de hand van het "Do no Harm" principe gehandeld. De hulp wordt zoveel mogelijk gelijk verdeeld over bevolkingsgroepen om spanningen te voorkomen. Het vergt een grote mate van flexibiliteit om met de steeds veranderende context om te gaan. Niet alleen van de hulpverleners, maar ook van de donoren.

Rustplekken voor Atjeese kinderen (Unicef Nederland)

Daags nadat de vloedgolven het leven in de Indonesische provincie Atjeh hadden overspoeld, startte Unicef met noodhulp. Ook werden er centra opgezet waar kinderen tot rust konden komen, konden spelen en leren. Afgelopen jaar is met man en macht gewerkt om deze centra structureel te maken. Geen tenten, maar een stenen gebouw. En een goede organisatie, met hulp van de lokale bevolking. In verschillende centra hebben het afgelopen jaar ruim 17.000 kinderen rust gevonden. Ze werden geregistreerd, kregen sociale ondersteuning en konden weer kind zijn. Eén van deze centra is het totaal vernieuwde Muhammadiyah-kindercentrum in Labui, nabij een klein vissersdorp in het westen van Atjeh. Dagelijks komen hier 50 tot 100 kinderen om er te dansen, tekenen en studeren. Unicef heeft gezorgd voor leermaterialen, boeken, speelgoed en sportmaterialen.

Bijlage 1

Overzicht van baten en lasten (in €)

		Committering	Overmaking	Besteding
1 BATEN				
1.1	Beschikbaar gestelde SHO tsunami fonds	199.053.500		
1.2	Ruimte AKV SHO	11.913.210		
1.3	Beschikbaar gestelde bijdrage van het Ministerie	5.000.000		
1.4	Ruimte AKV Ministerie	145.631		
1.5	Netto SHO tsunami fonds	191.994.659		
1.6	Rentebaten	2.494.286		
1.7	Totaal baten	194.488.945		
<hr/>				
		Committering	Overmaking	Besteding
2 LASTEN				
2.1	Verstrekke steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)	91.914.792	69.961.788	54.542.011
2.2	Steun via internationale koepel	39.928.816	39.725.149	16.386.634
2.3	Direct verstrekke hulp door de organisatie zelf	15.100.699	6.842.921	5.342.226
2.4	Uitvoeringskosten in NL	5.249.022	2.663.624	2.202.197
2.5	Uitvoeringskosten ter plaatse	2.501.850	1.812.195	1.417.716
2.6	Totaal lasten	154.695.179	121.005.677	79.890.784
<hr/>				
3 Balans 31 december 2005		39.793.766	73.483.268	114.598.161

Toelichting per rubriek

1 BATEN

1.1 Beschikbaar gestelde SHO-gelden

Lidorganisaties en gastdeelnemers hebben een bedrag van € 199.053.500 ontvangen uit de actie.

1.2 Ruimte AKV SHO

De SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers hebben de ruimte om maximaal 6% aan apparaatskosten (AKV= apparaatskostenvergoeding) uit te geven. Er worden kosten gemaakt voor de coördinatie, uitvoering en monitoring van de hulpverlening. De organisaties proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk geld direct aan de hulp ten goede kan komen. Enkele organisaties hebben al aangegeven dat zij ruim onder deze 6% blijven. De werkelijke omvang van de apparaatskosten zal in het eindrapport worden weergegeven.

1.3 Beschikbaar gestelde bijdrage van het Ministerie

Lidorganisaties hebben een totaalbedrag van € 5.000.000 ontvangen van de bijdrage van het Ministerie.

1.4 Ruimte AKV Ministerie

De SHO-lidorganisaties hebben de ruimte om maximaal 3 % aan apparaatskosten uit te geven. De organisaties stellen alles in het werk om deze kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk geld direct aan de hulp ten goede kan komen. De feitelijke besteding aan AKV zal in het eindrapport verschijnen.

1.5 Netto SHO tsunami fonds

Na aftrek van de ruimte AKV blijft het bedrag over wat direct aan de hulp ten goede komt.

1.6 Rentebaten

Wanneer de ontvangen SHO tsunami fondsen op de bankrekening worden aangehouden wordt er rente ontvangen. Deze rentebaten komen ten goede van projectactiviteiten. Gedurende de verslagperiode is € 2.494.286 rente ontvangen.

1.7 Totaal baten

In totaal beschikken de SHO lid- en gastorganisaties over een bedrag van € 194.400.690 dat aan de hulpverlening kan worden besteed.

2 LASTEN

2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)

De gelden die bestemd zijn voor de uitvoerende partnerorganisaties (ter plaatse) ten behoeve van de uitvoering van de hulpverlening.

2.2 Verstrekte steun via internationale koepel

De gelden die bestemd zijn voor hulpverleningsprogramma's die uitgevoerd worden via internationale koepelorganisaties.

2.3 Direct verstrekte hulp

De gelden die direct door de SHO-lid/gastorganisatie (in de vorm van aankopen van bijvoorbeeld hulpmateriaal) worden bestemd voor uitvoering.

2.4 Uitvoeringskosten in Nederland

Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op werkzaamheden verricht door medewerkers van de SHO-lid/gastorganisatie in Nederland.

2.5 Uitvoeringskosten ter plaatse

Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op werkzaamheden verricht door medewerkers van regiokantoren van de SHO-lid/gastorganisatie.

2.6 Totaal lasten

In totaal is er € 154.695.179 (80%) gecommiteerd en € 121.005.677 (62%) overgemaakt aan uitvoerende organisaties ter plekke c.q. de internationale koepels, dan wel betaald door de organisaties zelf. In de getroffen gebieden is € 79.890.784 (41%) besteed van de totaal baten.

3 BALANS

In totaal is er nog een committeringsruimte van € 39.793.766 (20%). Een totaal van € 73.483.268 (39%) is nog beschikbaar aan liquiditeiten en € 114.598.161 (58%) aan bestedingsruimte.

Bijlage 2

Verdeling van de inkomsten van de actie

Na aftrek van de reserveringen worden aan de hand van een overeengekomen verdeelsleutel, de bedragen aan de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers overgemaakt (tabel). Dit gebeurt in termijnen en in totaal is er tot nu toe een bedrag € 204.053.500 overgemaakt.

Tabel 3: Verdeling van de inkomsten van de actie per 31 maart 2006 (in €), inclusief de bijdrage van het Ministerie.

Organisatie	SHO tsunami fonds
SHO-lidorganisatie	
Mensen in Nood/Cordaid	39.311.798
Nederlandse Rode Kruis	31.489.754
Kerkinactie	29.917.424
UNICEF	23.911.894
Oxfam Novib	21.753.211
Stichting Vluchteling	17.378.009
Terre des Hommes	13.523.544
TEAR fund	11.014.366
Subtotaal	188.300.000
Gastdeelnemers	
Hivos	3.000.000
Habitat for Humanity	3.000.000
Plan Nederland	2.250.000
ZOA Vluchtenlingenzorg	2.000.000
Save the Children	1.750.000
CARE Nederland	1.236.000
SOS Kinderdorpen	1.000.000
TPG Post/ World Food Programme	500.000
Family Help Programme	542.500
World Vision Nederland	475.000
Subtotaal	15.753.500
Totaal	204.053.500

Bijlage 3

Schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie

In het schema op de volgende pagina's wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van humanitaire hulp:

- a. Noodhulp: hulp die voorziet in de eerste levensbehoefte van mensen die zijn getroffen door een ramp
- b. Wederopbouw: het proces en de activiteiten gericht op het herstellen van economische, sociale en psychosociale infrastructuur die beschadigd is door een ramp.

De cijfers in het schema corresponderen met sectoren van humanitaire hulp. Deze zijn:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Gezondheidszorg | Levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieën, psychologische ondersteuning, opsporen vermisten, pleitbezorging en voorlichting. |
| 2. Water & Sanitaire voorzieningen | Water, sanitaire voorzieningen, pleitbezorging en voorlichting. |
| 3. Voedselzekerheid | Voedselhulp, voedingshulp, pleitbezorging en voorlichting. |
| 4. Levensonderhoud | Visserij, handel, milieu, transport, huishoudelijke artikelen, pleitbezorging, voorlichting en microkrediet. |
| 5. Onderwijs | Onderwijs, pleitbezorging en voorlichting. |
| 6. Huisvesting | Tijdelijk onderdak, permanent onderdak, pleitbezorging en voorlichting. |
| 7. Rampen management | Voorbereid zijn op rampen, vroegtijdige waarschuwingssystemen, bescherming, capaciteitsopbouw, monitoring, pleitbezorging en voorlichting. |
| 8. Programma management | Planning & programma management in het veld of ondersteuning, monitoring & evaluatie. |

Noodhulp in India

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management	1. Basisgezondheid is verstrekt, bewustwordingsactiviteiten voor gezondheid uitgevoerd; psychosociale hulp verstrekt. 2. 62 toiletten gebouwd, 3 open putten geslagen, watertanks verstrekt, water gezuiverd, maandverband en schoenen voor vrouwen en kinderen verstrekt. 3. Voedselhulp gegeven. 4. Distributie van noodhulpgoederen. 5. Speeltuinen opgezet, tijdelijke scholen opgezet. Schoolmaterialen verstrekt. Studenten vervoerd tot dat waterpeil gedaald is. Sportmaterialen verstrekt aan scholen. 6. Tijdelijke scholen gebouwd. Huizen gerepareerd. Materialen voor tijdelijke huizen verstrekt. 7. Vrijwilligers getraind in rampenparaatheid, vrijwilligers getraind in gezondheid en gemeenschapsontwikkeling. Capaciteitsversterking: cursus traumacounseling voor basiswerkers.	400.221
Mensen in Nood/ Cordaid	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud	1. 10 partners hebben gezondheid van slachtoffers verbeterd en bijgedragen aan voorkomen epidemieën door verstrekken medische hulp en medicijnen en hygiëne en gezondheidsvoorlichting; 5 partners hebben psychosociale zorg geboden. 2. 4 partners hebben bijgedragen aan voorkomen van epidemieën door het bieden van veilig drinkwater en toiletten. 3. 9 partners hebben noden van slachtoffers gelenigd met distributie van voedsel en voedselvoorwerk activiteiten; 4 partners hebben bijvoeding gegeven voor kinderen en zwangere vrouwen. 4. 10 partners hebben noden van slachtoffers gelenigd door verstrekken van noodhulpgoederen met speciale aandacht voor noden van specifieke (kwetsbare) groepen: vrouwen, gehandicapten, dalits. 6 partners hebben bijgedragen aan eerste herstel van inkomen door reparatie boten, beschikbaar stellen visnetten en naaimachines en bieden van training.	335.829

	<p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p> <p>8. Programma management</p>	<p>5. 9 partners hebben bijgedragen aan terugkeer naar school en voorkomen drop-out van kinderen door beschikbaar stellen van schoolmaterialen en transport naar school en het aanbieden van bijlessen.</p> <p>6. 6 partners hebben tijdelijke huisvesting en reparatie van huizen voor slachtoffers verzorgd; 5 kindercentra zijn opgezet.</p> <p>7. Versterken van NGO's door workshops en bijeenkomsten te organiseren. Oprichten van een coördinatieorgaan, die 12 bijeenkomsten organiseerde waaraan 200 NGO's deelnamen; 50 NGO's participeren door data collectie, 3.000 personen hebben deelgenomen in consultatie, 25.000 nieuwsbrieven zijn verspreid en de NGO's zijn vertegenwoordigd in overheidsbijeenkomsten.</p> <p>8. 3 Indiase consultants begeleiden partners in projectmanagement en coördinatie.</p>	
Oxfam Novib	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p>	<p>1. De gezondheidssituatie is op een fatsoenlijk niveau gebleven, er zijn geen meldingen gedaan van ernstige ziektes of epidemieën uit de projectgebieden.</p> <p>2. Geen uitbraak van water gerelateerde ziektes gemeld uit projectgebieden.</p> <p>3. Voedselzekerheid van tsunami slachtoffers is veilig gesteld.</p> <p>4. Tsunami slachtoffers versterken in levensonderhoud door geld-voor-werk programma, verschaffen van dekens en keukengerei, kleding, visnetten en gedeeltelijke steun voor de aanschaf van catamaran en boten, ontzilten van land, omploegen landbouwgrond; zaaien, ontzilten kanalen, 7 ha mangrove planten, slib verwijderen uit drainage kanalen.</p> <p>5. Kinderen blijven op school en leren door verschaffen van onderwijsmateriaal.</p> <p>6. Waardige levensomstandigheden voor ontheemden door de tsunami door tijdelijk onderdak en reparatie van beschadigde huizen.</p>	303.840
TEAR fund	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p>	<p>1. Mensen kunnen zich weer op hygiënische wijze wassen en verzorgen.</p> <p>2. Mensen hebben weer toegang tot schoon en voldoende drinkwater.</p> <p>3. Uitdelen van gekookt voedsel en andere voedingsmiddelen.</p> <p>4. Bevolking voorzien in basisbehoefte door noodhulpgoederen te distribueren samen met lokale partners.</p>	35.927

	6. Huisvesting 8. Programma management	6. Het onderbrengen van families in tijdelijke huisvesting. 8. Projecten zijn uitgevoerd doordat vrijwilligers zijn ingezet en administratieve en financiële ondersteuning.	
Terre des Hommes	4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting	4. 9.005 kledingsets verspreid, 400 babypakketten verspreid. 5. 17.650 school pakketten verspreid, 25 scholen hersteld. 6. 140 tijdelijke huizen gebouwd.	26.757
Gastorganisatie			
Hivos	3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting	3. Voedselzekerheid veiliggesteld voor tsunami getroffen gemeenschappen tijdens januari en februari 2005, ondersteund in het verzekeren van een continue voedselvoorziening aan getroffen gemeenschappen. 4. Voorzien in noodzakelijke kleding aan de gemeenschappen in twee districten van Tamil Nadu. 6. Tijdelijk onderdak gebouwd voor 397 families in Nagapattinam District en 15 families in Kanyakumari District van Tamil Nadu.	30.000

Wederopbouw in India

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorziening 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs	1. Mobiele voorzieningen voor gezondheidszorg georganiseerd. Voorlichting gezondheid, hygiëne en sanitaire voorzieningen, medicatie voor ontwormen verstrekt aan kinderen. Psychologische ondersteuning van kinderen, door directe traumacounseling en indirect door opzetten van activiteiten in zgn. Children Circles, psychosociale hulp verleend aan getraumatiseerde slachtoffers. 3 gezondheidsklinieken in gemeenschappen. Doorverwijzen naar klinieken. Ondersteuning voor dalits in medische hulp. 2. 31 herentoiletten gebouwd, 31 vrouwentoiletten gebouwd, 10 wasruimtes gebouwd; 15 waterputten gebouwd en hersteld. 3. Extra voedsel voor kinderen die naschoolse opvang bezoeken. 4. Kleine handelaren gesteund door verstrekken gereedschap. Materialen aan kippenboeren verstrekt. Vismaterialen verstrekt. Vrouwen getraind in naaiarbeid en het maken van pickles, kaarsen, wierook, zeep, palmbbladproducten, drogen van vis en speelgoed. Geld-voor-werk voor boeren. Vaardigheidstraining voor vrouwen en jongens. Hulp verstrekt aan ouderen en zieken, zodat hun families inkomens hebben. Materialen verstrekt aan kleinschalige handwerklieden. Kleinschalige handel opgezet voor kwetsbare families. Momenteel worden zelfhulp groepen van vrouwen opgezet om deze te verbinden met inkomensgenererende activiteiten: kippenhokken en koestallen gerepareerd. Ondersteuning voor weduwen en dalits om inkomenspositie te versterken, voorlichtingscampagne dmv straattheater over belang en deelname aan inkomensgenererende activiteiten. 114 catamarans, 140 fiberglas boten en 162 buitenboordmotoren gemaakt; 11 buitenboordmotoren gerepareerd; 1.718 netten verstrekt 5. 5 speeltuinen opgezet. Drop-outs gaan weer naar school. Leermiddelen aan zgn. Childrens Circles verstrekt. Informeel onderwijs wordt ver-	50.642

	<p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>strekt aan leerlingen die het reguliere schoolsysteem niet (meer) volgen. Ondersteuning voor kinderen van dalit families in educatie. Ondersteuning meisjes in tekstboeken en verblijf op school. Ondersteuning gehandicapte kinderen voor schoolmaterialen.</p> <p>6. Slechte tijdelijke huizen van NGO's gerepareerd op verzoek van de overheid (eerste instantie niet gepland. Huizen herbouwen begonnen, 10 huizen gebouwd.</p> <p>7. Cursus in traumacounseling voor leden van basisgroepen en professionele hulpverleners uitgevoerd. Training van NGO staf op pedagogisch gebied en nadruk op traumaverwerking. Training van moeders, verenigd in zgn. Mothers Associations op gebied van kindbescherming (handel, misbruik, kinderarbeid), met nadruk op gender, cursus traumacounseling voor leden van basisgroepen uitgevoerd. Theaterworkshop uitgevoerd.</p>	
Mensen in Nood/ Cordaid	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water en sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>1. Bijdrage geleverd aan de opvang en verbetering van psychosociale en gezondheidszorg voor (wees)kinderen door counseling; stafleden van 11 NGO's getraind in integratie HIV/Aids om aandacht voor HIV/Aids binnen tsunami activiteiten te krijgen.</p> <p>2. vergroten van toegang tot schoon drinkwater door installatie 2 watertanks.</p> <p>4. Bijdrage aan het herstel van inkomsten van vissers door het verstrekken voor visnetten, boten. Bijdrage geleverd aan het ondersteunen van vrouwen door inkomensgenererende activiteiten; ondersteuning van pleitbezorging.</p> <p>5. Bijdrage geleverd aan kinderen en schooluitval voorkomen door 1.700 kinderen schoolkosten te betalen en schoolmateriaal te leveren. Inschrijvingscampagnes op school georganiseerd, waardoor 74 drop-outs opnieuw naar school gaan. Assistent juridisch medewerkers getraind.</p> <p>6. Voorzien in onderdak door 36 beschadigde huizen te herstellen.</p> <p>7. Gemeenschappen beter voorbereiden op rampen door risico analyse, documentatiecentrum op te zetten, training personeel NGO om op rampen voorbereid te zijn. Mangrove kwekerij opgezet en mangrove geplant, informatie over verzekering gegeven.</p>	8.075

Oxfam Novib	<p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>3. Toevoegen van 700 buiten beschouwing gelaten adivasi families in de overheidslijst door te lobbyen voor overheidssteun. Voorzien in voedsel aan de families die nog geen overheidssteun krijgen.</p> <p>4. Verschaffen van netten, boten en buitenboord motoren aan getroffen families, versterken van levensonderhoud door ondersteuning vee, bootreparatie, landterugvordering en kleine handelsactiviteiten.</p> <p>5. Onderwijs hersteld voor een aantal scholen.</p> <p>6. Verbeterde huisvestingssituatie voor tsunami getroffen families.</p> <p>7. Betere voorbereiding op rampen door gemeenschappen. Planten van kustvegetatie om gemeenschappen te beschermen voor rampen</p>	351.440
TEAR fund	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>1. Moeders en kinderen in 20 dorpen voorgelicht over preventieve gezondheidszorg.</p> <p>3. 1.000 families hebben noodzakelijk inkomen door 'geld-voor-werk' programma.</p> <p>4. 915 vissers kunnen weer vissen en inkomen vergaren door bouw van boten met motoren en netten. Vrouwen kunnen vis koelen voor betere marktprijzen door visopslagcontainer. Vrouwen hebben aanvullend inkomen door het krijgen van koe.</p> <p>6. Eerste serie huizen is bewoond, afronding verwacht in derde kwartaal 2006.</p> <p>7. 1 groep van trainers getraind en werkzaam in eigen dorp.</p>	12.322
Terre des Hommes	<p>5. Onderwijs</p>	<p>5. Onderwijsmateriaal verspreid, 110 leraren getraind.</p>	6.831
Gastorganisatie			
Habitat for Humanity	<p>6. Huisvesting</p>	<p>6. 66 huizen in Sulerikattukuppam zijn opgeleverd, 79 huizen worden gebouwd. Het modelhuis voor de derde bouwlocatie is klaar en wegwerkzaamheden zijn gestart.</p>	
Hivos	<p>4. Levensonderhoud</p> <p>7. Rampen management</p> <p>8. Programma management</p>	<p>4. 80 boten, 59 kano's, 71 buitenboordmotoren, 110 catamarans en netten zijn verspreid onder vissers.</p> <p>7. Projectmanagement capaciteit versterkt van lokale organisatie.</p> <p>8. De organisaties zijn in staat de efficiëntie te verbeteren van het rehabilitatieprogramma en rampenmanagement.</p>	3.420

Noodhulp in Indonesië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p>	<p>1. 169 vrijwilligers betrokken bij de opzet van medische posten, 3 mobiele klinieken gaven medische zorg aan 2.100 getroffen. Bijgedragen geleverd aan het voorkomen van 'burnouts' en oververmoeidheid, verschillende doelgroepen bereikt: families, kinderen, vrouwen hulpverleners. Javaanse staf wordt steeds meer vervangen door zelfopgeleide Atjeese stafleden. Samenwerking met Atjeese organisaties. Pakhuis gehuurd, 2 auto's en motorfiets voor logistiek. Training voor vrijwilligers in Atjeh, alternatief onderwijs in drie dorpen, medische zorg en medicijnen verstrekt. Kinderen met leerachterstand worden begeleid. Er is een rijdende bibliotheek die wekelijks alle dorpen aandoet. Behoeften van 6.000 gehandicapten in kaart gebracht en concrete acties voorgesteld. Gezondheidsdiensten in 9 eenheden verstrekt, training gedaan en getraumatiseerde en gehandicapten ondersteund. 36 vrijwilligers zijn getraind en een coördinator benoemd, andere organisaties betrokken in netwerk traumacounseling, steun aan traumacentrum in Nias. Medische diensten geleverd aan 9.000 patiënten (januari tot mei), waaronder 40 operaties; Tandheelkunde voor 1.350 mensen (januari - mei); 142 medisch personeel getraind in counseling vaardigheden; Nieuwsbrief gezondheidsvoorlichting uitgegeven in drie kampen in oplage van 50.000.</p> <p>3. Geen gevallen van honger voorgekomen. Voedsel aan 78 families gedurende drie maanden; 13.4 ton voedsel en noodhulpgoederen voor 2.350 families, 1-3 maanden voedselpakketten en kookgerei aan meer dan 6.000 ontheemde families in tentenkampen.</p> <p>4. Puin geruimd in 15 desa's in het district Aceh Besar met een totale oppervlakte van 300 ha land, 5 religieuze centra, overheidskantoren, een school en een begraafplaats zijn schoongemaakt. 7km weg en bruggen zijn weer toegan-</p>	243.218

	<p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>kelijk gemaakt. In Jakarta zijn goederen en geld ingezameld en in Atjeh verdeeld. In Sumatra goederen gekocht, zoals bouwmaterialen, schoolspullen, etc. Onderzoek gedaan naar de mensenrechtensituatie in Atjeh na de ramp en lot van gevangenen. 51 vrijwilligers naar Atjeh om lijken te bergen en assistentie te verlenen aan de hulpverleners in de kampen. Na de crisisfase zijn met hulp van architecten 4 buurthuizen, 10 eenvoudige huizen en een bibliotheek gebouwd. Samen met de bevolking is onderwijs en gezondheidszorg weer opgestart; Economische activiteiten van levensonderhoud van groep ontheemden voorbereid en gestart. Met groot materiaal puin geruimd op Nias, werk wordt uitgevoerd door 15 vrijwilligers en 3 stafleden. Er zijn 217 gebouwen in het stadscentrum geruimd waardoor de hoofdstad 70% schoon is, na het puinruimen is de bevolking begonnen met bouw van onderkomens en komt de lokale economie weer op gang. Ook deed men lobbywerk; in Pidie is een vrouwencollectief opgericht voor kleinschalige economische activiteiten.</p> <p>5. Kinderen ontvingen onderwijsmaterialen en lesgeld.</p> <p>6. 513 familietenten uitgedeeld. Plannen voor permanente huizenbouw voorbereid. Alle families hebben toegang gekregen tot een tijdelijk huis, 14 families migreerden.</p> <p>7. Publicatie eenheid opgezet: tijdschrift en website met door lokale verslaggevers verzameld nieuws en gegevens, tijdschrift met 40-60 pagina's verschijnt maandelijks in Engels en Bahasa Indonesia met oplage van 5.000, publicatie van artikelen. Informatieprogramma is voortgezet in een commerciële krant en magazine; 4 organisaties zijn redelijk hersteld en draaien weer. 3 lokale organisaties hebben kantoor hersteld en ingericht. 1 huurt ander gebouw. Direct hulp geboden aan de lokale relaties van het TAMASYA netwerk in Atjeh. Op 18 locaties in Aceh Besar is ondersteuning geboden op het gebied van coördinatie en communicatie, bevoorrading (kleding, voedsel), bouwmaterialen en uitrusting. In strategisch planning besloten dat men zich zal richten op monitoring en pleitbezorging van ESC rechten (Economic, Social, Cultural rights).</p>	
--	---	--	--

	8. Programma management	8. Twee ACT kantoren zijn geopend, een gezamenlijk programma wordt uitgevoerd en daarop wordt begeleid en toezicht gehouden door Ernst & Young.	
Mensen in Nood/ Cordaid	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting	1. 5.461 patiënten behandeld en medicijnen ontvangen door 8 mobiele medische teams, 7 ziekte surveillancerapporten gemaakt voor 9 locaties (dorpen en kampen) in Atjeh om de medische situatie te inventariseren. 9161 patiënten geholpen door lokale partners op gezondheidseenheden te zetten in 4 locaties. Coördinatiekantoor met bekwame staf en communicatie faciliteiten in Medan functioneel en ondersteunend voor medische teams. Onderzoeken uitgevoerd, medicijnen vervoerd, vergunning gegeven aan hulporganisaties, personeel geworven, planningsbijeenkomsten gehouden, technische assistentie etc. Voorziening van medische materialen: 2 complete kits (elk voor 10.000 patiënten voor 3 maanden) met medicijnen zijn gedistribueerd: 2 ziekenhuistenten ter beschikking gesteld. Patiënten behandeld in de 2 ziekenhuistenten. Verspreiding van ziektes tegengegaan en gezondheidszorg verzorgd voor ontheemden in afgelegen gebieden door 7 medische teams. 3. Voedsel gedistribueerd aan 6.000 huishoudens en 1.370 schoolkinderen aan de oostkust van Atjeh. 4. Shelter kits (dekens, matjes, lampen, keukenspullen etc) gedistribueerd voor 1.000 families, distributie door 40 getrainde gemeenschapswerkers. Zeep ter beschikking gesteld voor distributie aan vrouwen. 6. 1.737 huishoudens hebben tijdelijk onderdak in vorm van tent.	78.759
Nederlandse Rode Kruis	4. Levensonderhoud	4. 141.100 mensen in zuiden en oosten Nias zijn voorzien van schoon drinkwater. 5.400 mensen zijn medisch behandeld. Voedsel en hulpgoederen zijn gedistribueerd. Behoeften aan voedsel en hulpgoederen aan meer dan 250.000 mensen voorzien. 91.000 mensen hebben van basis of preventieve gezondheidszorg gebruikt gemaakt. Ruim 100.000 personen hebben toegang tot schoon drinkwater. Uitbraak van infectieziekten is voorkomen door water en sanitaire interventies. Vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis hebben meer dan 60.000 lichamen geborgen. 300.000 mensen hebben huishoud kits ontvangen. In Banda Aceh heeft het Rode Kruis een noodhospitaal opgezet, waar 100.000	708.000

		mensen zijn behandeld. 3.400 mensen hebben contact hersteld met hun familie via het familie tracing programma van het Rode Kruis; In gehele programma is 90 ton voedsel en hulpgoederen (m.n. rijst, suiker, kooktoestellen) gedistribueerd op Nias.	
Oxfam Novib	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid	1. Consultatie en psychosociale ondersteuning, noodhulp en medicijnen om uitbraak van ziekten te voorkomen. 3. Distributie van noodhulp voedselpakketten en basisproducten. Na de aardbeving in Nias verspreiding van noodhulpgoederen.	22.000
Stichting Vluchteling	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting	1. In vier districten op Atjeh zijn 6 pakketten medicijnen en noodhulpmaterialen uitgedeeld en werden 48 mobiele klinieken opgezet voor de basisgezondheidszorg. Op 45 locaties werden medische diensten aangeboden via mobiele medische teams. Medische diensten werden verzorgd in 30 bestaande klinieken in 3 districten in Atjeh. Noodhulpbehandelingen werden uitgevoerd in Zanioel Abidin ziekenhuis. In 3 districten waren counseling activiteiten voor getraumatiseerde slachtoffers. In samenwerking met een medische school in Banda Atjeh werd medische staf geïdentificeerd en getraind. 2. Op 2 locaties in Atjeh Utara werden lokale mensen opgeleid en ingezet in de muskieten bestrijdingscampagne 4. Projecten zijn uitgevoerd via geld-voor-werk, water/sanitaire voorzieningen en trainingsprogramma's. 6. Transport van 400 ton noodhulpgoederen voltooid en distributie via lokale comités en uitvoerende organisaties voltooid.	26.875
TEAR fund	2. Water en sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs	2. Nieuwbouwplannen ontwikkeld met een water expert. 5. Ontwerp van school gemaakt en ligt klaar voor uitvoering.	38.156
Terre des Hommes	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 5. Onderwijs	1. 629.952 capsules van vitamine A en Iodine verspreid; 3 veldklinieken opgericht, mobiele klinieken gehouden. 2. 70 water putten hersteld, 16 publiekslatrines gebouwd. 3. 766 ton aan voedsel getransporteerd en verspreid. 5. 3.160 pakketten met onderwijsmateriaal verspreid.	332.344

UNICEF	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>5. Onderwijs</p>	<p>1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid van getroffenen (medicijnen en vaccinaties). Pleitbezorging, opzetten van klinieken in alle opvangkampen. Identificatie en bescherming van niet-begeleide kinderen. Vrouwen en kinderen beschermd tegen malaria.</p> <p>2. Verbeterde water en sanitaire voorzieningen door toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en schone sanitaire voorzieningen. Toegang tot 5 l. zuiver drinkwater per dag per persoon. Mogelijkheid tot en gebruik van dagelijkse sanitaire voorzieningen, dagelijkse hygiëne, opzetten van tijdelijke watervoorzieningsystemen in "spontane" opvangkampen. 789 opvouwbare watertanks geleverd.</p> <p>5. Opzetten van 4.667 noodscholen zodat 90% van schoolgaande kinderen weer naar school kan.</p>	1.165.700 (via internationale koepel)
Gastorganisatie			
Hivos	<p>Gezondheidszorg</p> <p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>7. Rampen management</p> <p>8. Programma management</p>	<p>1. 750 lichamen geborgen, 30.000 patiënten behandeld.</p> <p>3. Voorzien in voedselhulp voor ontheemden in Atjeh en Noord-Sumatra, opzetten van gemeenschapskeukens in Atjeh en Noord-Sumatra.</p> <p>4. Voorzien in noodhulpgoederen voor 5.100 ontheemden in Atjeh en 600 in Noord-Sumatra.</p> <p>7. Productie, uitzending en ontvangst van nood informatie radio programma voor 158 ontheemdenkampen en andere ontheemden, 302 vrijwilligers geworven, opzetten van 2 distributie- en coördinatievestigingen, training en financiële steun van 20 (radio) journalisten die bijdragen aan het noodprogramma.</p> <p>8. Bijdrage aan de efficiëntie van het programma-management.</p>	100.000
Save the Children	<p>3. Voedselzekerheid</p> <p>4. Levensonderhoud</p>	<p>4. Kwetsbare groepen vrouwen en baby's zijn geholpen een moeilijke periode door te komen met 10.870 pakketten voedingssupplementen voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen.</p> <p>4. 2.250 families met weinig bezittingen en zonder onderdak hebben in de noodhulpfase een pakket ontvangen met essentiële goederen voor het dagelijkse huishouden.</p>	35.240
TNT/WFP	<p>4. Levensonderhoud</p>	<p>4. Logistieke expert ingezet voor ondersteuning ten behoeve van WFP operaties, IT en communicatie infrastructuur opgezet voor WFP operatie, transport services ten behoeve van WFP of uitvoerende partners van WFP.</p>	n.v.t.

Wederopbouw in Indonesië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water en sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p>	<p>1. In 6 dorpen zijn groepen gevormd en getraind die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van medische programma's. Permanente kliniek opgezet, extra voeding voor moeder en kind, voorlichting gegeven door lokale staf. Trainingen verzorgd voor dorpsgezondheidswerkers, 65 vrijwilligers, predikanten en onderwijzers. Trauma's van vrouwen en kinderen zijn verminderd. Met behulp van een mobiele kliniek wordt gezondheidszorg en voorlichting geboden op 11 locaties en zijn 1.000 hygiënepakketten uitgedeeld.</p> <p>2. In Langung zijn 71 van de geplande 350 wateraansluitingen klaar, in Langkak waren dat er 67 van 100. In Koala Baru is de uitvoering 50%; 37 drinkwaterpunten gebouwd, 230 pitlatrines gebouwd; 40% heeft toegang tot veilig drinkwater en verbeterde sanitaire voorzieningen.</p> <p>4. Onderzoek gedaan, gereedschap en curriculum uitgedeeld; 25 boten gereed, 35 groepen gevormd, 3 kredietgroepen getraind, 25 families verdienen een inkomen met bouw van boten; economische behoeften en potenties worden geïnventariseerd, drie groepen in Langkak startten met economische activiteiten, waarbij gereedschap en zaaigoed werden verstrekt. Herbouw garnalenvijvers in Lampaseh Aceh; in totaal 85 ha met 150 inlaatsluizen en ondersteuning bij productiestart tot juli 2006. Per jan. 2006 waren 65 ha vijvers hersteld. Roulerend fonds gestart met 75 kwetsbare gezinnen voor economische activiteiten. Werkplaats voor botenbouw gebouwd en georganiseerd. 26 vrouwengroepen hebben economische activiteiten gestart in een kamp en in 3 dorpen. Levensonderhoud tot 50% hersteld. Er worden 10 boten gebouwd. Vrouwengroepen gevormd voor kleinschalige economische activiteiten in land- en tuinbouw, veeteelt, kiosken en ambulante handel. Er zijn 3 trainingen gegeven voor potentiële veehouders en managementtraining voor kleine onder-</p>	179.000

	<p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>nemers. In Atjeh is een eerste kredietvoorziening verleend; Gemeenschapshuis is geheel gerenoveerd.</p> <p>5. Traumaverwerking is een onderdeel geweest in het lesprogramma, naschoolse activiteiten bestaan uit sport, spel en tekenen/schrijven, gestimuleerd door publicatie op een muurkrant; 22 scholen zijn hersteld en 10 herbouwd, 13 scholen gemeubileerd en voor 23 scholen meubilair gefabriceerd. 53 scholen met zes lokalen en onderwijzershuis worden hersteld of herbouwd. Maandelijks wordt een tegemoetkoming in de studiekosten uitgekeerd aan 750 kinderen in 10 dorpen. Ook hebben deze kinderen voedselrijke maaltijden ontvangen; 1.159 kinderen ontvangen huisvesting, voeding, gezondheidszorg en onderwijs. Het kindertehuis is in gebruik.</p> <p>6. 32 families wonen in nieuw huis, 130 huizen klaar, met water en licht, overgedragen en bewoond. Twee wooncomités functioneren. In totaal zijn tot en met jan. 2006 298 huizen gebouwd. In 1 dorp grond aangekocht voor bouw van huizen voor huurders die anders geen recht op een huis hebben. Wel is begonnen met de bouw van stenen huizen voor de meest urgente gevallen binnen de doelgroep.</p> <p>7. Onderzoeksrapport over de huidige politieke, sociaal-economische situatie in het rampgebied gedaan. 4 nieuwe partners geïdentificeerd, 7 organisaties hebben financieel technische advies en ondersteuning gekregen. Tevens is de organisatie doorgelicht en zijn de behoeftes en mogelijkheden voor IT-ontwikkeling onderzocht. Training voor journalisten en managers van radiostations, de (her)bouw van radiostations in Lamno, Singil en Tapak Tuan zal in september zijn afgerond, 15.000 radio's met batterijen zijn uitgedeeld aan ontheemden, 1.000 studieboeken voor journalisten herdrukt en verspreid onder mediawerkers. Talkshow over vrede in Atjeh wordt sinds jan. 2006 iedere 2 weken geproduceerd en door 25 lokale radiostations uitgezonden en is in heel Atjeh te ontvangen. 17 gemeenschapswerkers worden getraind. Een monitoring methode is ontwikkeld. De infrastructuur van lokale partners is versterkt met 29 personen. Er zijn 2 workshops vredeseducatie en maandelijkse discussiebijeenkomsten georganiseerd. Bibliotheek (vredesopbouw en trauma-</p>	
--	---	---	--

	8. Programma management	<p>literatuur) in juni 2005 geopend. Restauratie van kantoren en bijkantoren is voltooid. Aan 51 families is een solidariteitsuitkering gedaan. De website www.indofo.nl is regelmatig bijgehouden met actualiteit over mensenrechten, conflictgebieden, leger en politie. Technische voorbereiding en trainingen in april/juni 2005, gevolgd door veldwerk; tot maart 2006 is ruim 6.000 ha dorpsgrond in kaart gebracht en sociale gegevens verzameld. Planning in volle gang in 12 dorpen.</p> <p>8. ACT coördinatie geregeld, met steun van Ernst & Young actieplannen voorbereid en eerste cyclus uitgevoerd; 4 nieuwe stafleden benoemd en inventaris voor kantoor aangeschaft.</p>	
Mensen in Nood/ Cordaid	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p>	<p>1. Ontwikkeling richtlijnen voor WHO en NTP voor ontheemdenkampen, afgifte van laboratoria materiaal plus 50 microscopen, voorraad medicijnen geleverd, rehabilitatie van provinciale dienst gebouw en uitrusting, TB training door WHO voor gemeenschapgezondheidscentra en 281 gezondheidspersoneel, 200 bijgeschoold. Voorlichting gegeven over vogelgriep.</p> <p>2. Bijdrage geleverd aan verbeterde water en sanitaire voorziening. Samenstellen materialen voor dorpen in uitvoering; training gehouden op gebied van water en sanitair, boorgaten, platformen en water tank en toren bij 21 scholen compleet, installatie van handpomp, elektrische pomp en distributiesysteem, zodra constructie af is om beschadiging te voorkomen, toilet en tanken op 9 plaatsen, constructie watertorens en opslag gestart bij 20 scholen.</p> <p>Introductiebijeenkomsten gehouden bij 20 scholen over gezondheid en hygiënezaken. Algemene groepsdiscussies gehouden bij de eerste 10 scholen, data verzameld en geanalyseerd.</p> <p>4. 200 vrouwen getraind in tassen maken, 200 naaimachines en 100 borduurmachines uitgedeeld plus materiaal. De vrouwen gebruiken dit als inkomensgenererende activiteiten; Herstelwerkzaamheden in 12 koffieverwerkingsbedrijven, 212 stoelen geleverd. Herstelwerkzaamheden in 1 koffieverwerking- en exportbedrijf, onderzoek afgerond naar levensonderhoud alternatieven en duurzaamheid; 3 lokale organisaties geïdentificeerd.</p> <p>5. Ontwerp voor aardbevingbestendige scholen en afgestemd en goedgekeurd met lokale autoriteiten, constructie 9 scholen. Fundering klaar voor</p>	17.615

	<p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p> <p>8. Programma management</p>	<p>7 scholen; staal constructie gestart voor 4 scholen; houtconstructie gestart, schooluniformen voor 4.985 schoolkinderen in Muara Batu, Seunuddon en Pusung. ontvangen, schoolgeld voor 400 leerlingen.</p> <p>6. 2 modelhuizen gebouwd, 4 aannemers hebben 650 huizen in aanbouw, fundering 332 huizen, grondwerk 255 huizen, palen 209 huizen en muren voor 121 huizen af: Supervisie opgezet, materiaal getest (staal, zand, etc.). Doelgroep werkt vrijwillig mee aan schoonmaak- en graafwerkzaamheden. Landeigendom onderhandeld voor samenwerking met RALAS (wereldbank) en lokale autoriteiten voor formaliseren certificaten</p> <p>7. Onderzoek gedaan naar de behoeften van de gemeenschap, rampenplannen ontwikkeld, commissies voor dorpsontwikkeling opgezet in de dorpen, introductiebijeenkomsten gehouden bij 20 scholen, algemene groepsdiscussies gehouden bij de eerste 10 scholen, schoolcomités van 10 scholen herstart; verkiezingen in gang gezet 5 personen per plaats voor supervisie; ook verantwoordelijk voor onderhoud; wegenbouw consultant heeft voorbereidingen genomen voor constructie weg (vluchtroute en toegang tot markten); training op basisvaardigheden aan 40 medewerkers van lokale organisaties.</p> <p>8. Cordaid kantoren gevestigd in Medan, Lhokseumawe en Sinabang.</p>	
<p>Nederlandse Rode Kruis</p>	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>6. Huisvesting</p>	<p>1. Uitvoering van project verloopt volgens planning. 40 motorfietsen en 3 auto's zijn afgeleverd. 2.000 klamboes lokaal vervaardigd door 15 vrouwen en gedistribueerd in Zuid Nias.</p> <p>6. 17 huizen frames en daken van project Gomo district zijn af. Proef project in Lahusa is vertraagd, doordat het hout niet beschikbaar was. Gezondheidspost wordt gebouwd. 96 huizen van project Lamreh zijn (bijna) gereed. Ook de bouw van het vrouwen centrum, hospitaal, bibliotheek, gemeenschapshuis, speeltuin zijn ook bijna afgerond. Momenteel wordt gekeken of NRK verder kan bijdragen aan de bouw van een permanente school en hulp kan bieden bij water en sanitaire voorzieningen. Meer dan 5.000 frames zijn gearriveerd, waarvan 4.444 frames zijn opgezet. Door de vertragingen in de levering van hout zijn nu pas 600 frames helemaal compleet.</p>	<p>12.380 (via internationale koepel)</p>

		Op dit moment wordt het hout in grote hoeveelheden geleverd, dus inhaalslag kan gemaakt worden in het afmaken van de shelters. Op Nias is voorbereidend werk gestart voor de fundering van de nieuwe klaslokalen. Bouwmateriaal is aangekocht.	
Oxfam Novib	4. Levensonderhoud 7. Rampen management 8. Programma management	4. Lokale NGO's getraind in inhoud en strategie van hun programma, vooral gericht financieel management. Steun aan 35 vrouwelijke zoutboeren op het gebied van bedrijfsfaciliteiten, kapitaal, techniek en marketing. Opzetten en management van kwekerijen, opzetten en managen van demonstratiekavels voor organisch landbouw, voorzien in technische en financieel steun aan lokale gemeenschappen over voedselverwerkingstechnologieën, aankoop van gereedschappen, voorzien in klein microkrediet. 7. Training in rampenmanagement aan lokale organisaties. Twee speciale uitgaven van wetenschappelijke tijdschriften over milieu en rampen management. Het verzorgen van een seminar over rampenmanagement. Onderzoeken in 6 kustgebieden zijn afgerond, terwijl 31 kustdorpen zijn geïdentificeerd voor rehabilitatie. 500 ha beplant met kustvegetatie, beleidsevaluatie van kustbronnen, management en ontwikkelen van richtlijnen. Vestigen van provinciaal forum. 8. Identificatie, onderzoek, veldbezoeken en regelmatige monitoring van projecten. Advies en begeleiding van projectpartners op alle componenten van projectuitvoering, lokaal kantoor en staf gereed, monitoring en evaluatiesystemen ontwikkeld en gereed.	12.740
Stichting Vluchteling	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud	1. De bouw van de kliniek in Rawa Pidie district is voltooid en in gebruik genomen. 9 mobiele klinieken zijn operationeel en voorzien in de basisgezondheidszorg. Herstel van een kliniek in Lambara Angan (Atjeh Besar) en voorziening van materialen en medicijnen. Herstel van medische diensten in Lapang voor lokale bevolking en ontheemden in TLC's. 2. Teams samengesteld die hygiënische omstandigheden in het TLC monitoren en campagnes organiseren. Teams samengesteld om drinkwater en sanitaire voorzieningen te bouwen. 4. Een totaal van 38 kleine economische projecten werd uitgevoerd. 79% in de visserijsector (boten-	91.000

	6. Huisvesting	<p>bouw, botenherstel, visverwerking en overige infrastructuur), 21% werd uitgevoerd in de sector handel, gezondheid, landbouw. 30 vrouwen volgden een vakscholingscursus. 10 economische projecten zijn toegekend in de landbouwsector voor verbouwen van rijst, gember, pepers, sojabonen en aardnoten. 3 projecten zijn voor de bouw van boten en visverwerking, 2 projecten werden gestart ter ondersteuning van pluimveehouderij, 64 projecten zijn ter ondersteuning van kleine bedrijfjes als traditionele koffiehuizen, reparatiewerkplaatsen, naaiateliers. In 2 projecten werden kleine pontjes gebouwd om vervoer van personen en goederen mogelijk te maken. In Pidie werden huishoudelijke goederen aangeschaft en gedistribueerd. Personen werden gesteund om lokale goederen zelf te produceren.</p> <p>6. Op 19 december 2005 werd de bouw van 4 gemeenschapshuizen voltooid en in gebruik genomen. Op 19 december 2005 werd de bouw van twee demonstratiehuizen voltooid; Herstel/bouw van de school in Datar Luas is compleet. Contracten met lokale bouwbedrijven zijn getekend en met de bouw van 434 huizen is begonnen.</p>	
TEAR fund	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>8. Programma management</p>	<p>1. Beheren van poliklinieken en ziekenhuis met 20 bedden (18.228 patiënten) en dagelijks bezoek aan kampen (9.552 patiënten).</p> <p>4. 16 boten in gebruik, 9 zandbaggerboten zijn gereed.</p> <p>5. Bouw is volop aan de gang. Opening verwacht in augustus 2006.</p> <p>6. Modelhuizen klaar voor besluitvorming met bevolking.</p> <p>8. Projectvoorstellen naar grotere NGO's geleid.</p>	38.156
Terre des Hommes	<p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p>	<p>2. Gezondheidscentra gebouwd en in werking; 12 waterzuiveringssystemen geïnstalleerd, 6 diepwaterputten geboord, 2 waterdistributiesystemen operationeel, 1 publiekssanitaire eenheid gebouwd.</p> <p>4. 108 vissersboten met uitrusting verspreid, 78 ha visvijvers hersteld, 1 kleermakersworkshop gebouwd en uitgerust waar 70 vrouwen de gelegenheid krijgen om inkomen te verwerven, 47 vrouwen starten kleermakersbedrijf, 66 kippenboerderijen gebouwd, 39 vrouwen verdienen hun inkomen door 4 gebaksproductie eenheden.</p>	19.844 (51% vrouwen)

	5. Onderwijs 6. Huisvesting	5. 6 scholen gebouwd, 4 scholen van schoolmateriaal voorzien, 542 kinderen kunnen naar school met schoolmateriaal. 6. 1.403 huizen overgedragen.	
UNICEF	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs	1. Psychosociaal hulplan opgezet en in werking. Interventies primaire en secundaire gezondheidszorg nog gaande. Immunisatie van kinderen jonger dan 5 jaar tegen polio. Bescherming van vrouwen en jonge kinderen tegen malaria met geïmpregneerde muskietennetten. Vroedvrouwen getraind en voorzien van materialen voor het bevorderen van veilige bevallingen in tijdelijke kampen. In het onderwijs werkzame staf getraind in psychosociale steun. Opzet en uitvoering van een programma tegen ondervoeding. Hulp aan de regering bij het ontwikkelen van systemen voor pleegouderschap in uitvoering. Omvorming van kindercentra in jongerenclubs in uitvoering. Voorbereiding van communicatiecampagne tegen seksueel misbruik, uitbuiting en handel in kinderen. Medicijnen gekocht om micronutriënttekort te voorkomen. 2. Personele capaciteit van de overheid aangevuld. Toegang tot zuiver water en sanitaire voorzieningen door herstel en bouw van 252 waterpunten en 13 watersystemen in dorpen, gezondheidscentra en kampen. Instructie van scholieren als trainers om hygiëne te promoten in 105 bestaande en 500 nieuwe scholen is in uitvoering. 5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolstelsel incl. schoolmaterialen en training onderwijzers. Onderwijs van resterende 10% van schoolgaande kinderen hervat. Onderwijzend personeel gerekruteerd en getraind. Training van schoolpersoneel en leerlingen in rampenparaatheid, vredesonderwijs en 'life skills'. Herhalingstraining in planning, management en uitvoer van onderwijsprogramma's is in voorbereiding, 100 tijdelijke scholen gebouwd, 100 scholen in aanbouw, Locatie bepaald, tekeningen gemaakt en begin gemaakt met bouw van 300 permanente aardbevingsbestendige en kindvriendelijke scholen. Herstel en inrichting van 200 bestaande scholen is in uitvoering. Implementatie van het 'Creating Learning Community for Children' model en training van leraren in psychosociale genezing is in voorbereiding.	556.924 (via internationale koepel)

Gastorganisatie			
Habitat for Humanity	6. Huisvesting	6. 130 huizen gebouwd in Mulia; 50 huizen in Kranat Luar.	698
Hivos	4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management	4. Onderzoek naar behoefte bijna afgerond. 5. 150 gemeenschapsorganisatoren hebben trainingen gekregen in organische landbouwmethoden en gemeenschapsorganisatie. 6. 90 huishoudens hebben een fatsoenlijke woning, 2 huizen in aanbouw, 20 huizen worden gerepareerd. 7. Slachtoffers in 158 IDP kampen en andere ontheemden hebben informatie ontvangen over rehabilitatieprogramma's, laatste ontwikkelingen in hun regio's, informatie over de situatie van andere slachtoffers en entertainment door productie, uitzendingen en ontvangst van radio-programma's. Technische assistentie aan 35 en capaciteitsopbouw van 20 lokale organisaties, assisteren van 25 lokale organisaties bij voorstellen schrijven voor fondsen. 8. Monitoring van het werk van 27 lokale organisaties, evaluatie van het project van 5 organisaties.	120.000
Save the Children	1. Gezondheidszorg 5. Onderwijs	1. Psychosociaal programma ontwikkeld en uitgevoerd op 200 scholen waarmee 394 leerkrachten getraind zijn en 5.801 kinderen bereikt. Dit leverde een bijdrage aan traumaverwerking van kinderen. Productie van een instructievideo voor psychosociale therapie voor ouders en kinderen. 5. In november is de bouw van de eerste 20 scholen gestart, funderingen zijn gelegd.	6.633
World Vision	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen	1. 260 huishoudens hebben toegang tot nieuw gebouwde tijdelijke gezondheidsklinieken, medewerkers van twee gezondheidsklinieken in Lamno subdistrict kregen twee motorfietsen. 2. De gemeenschap van Ujong Sudheun heeft toegang tot zes tijdelijke openbare toiletten.	1.540

Noodhulp in Myanmar

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Oxfam Novib	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid	1. 517 families voorzien van dekens en muskietennetten. 3. 517 families hebben rijst gekregen.	

Wederopbouw in Myanmar

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Oxfam Novib	4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6 Huisvesting	4. Van 70 huishoudens is het levensonderhoud hersteld via visboten en visnetten, 4.000 mensen werden geholpen door constructie van een brug. 5. 387 leerlingen hadden profijt van herstel van schoolhekken en 30 kregen een bureau. 6 10 huizen hersteld in de staat Shan.	

Noodhulp in Somalië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	3. Voedselzekerheid 6. Huisvesting	3. Voedselhulp van 1.550 families. 6. Distributie van plastic platen en dekens aan 5.200 families.	40.500
Oxfam Novib	2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 6. Huisvesting 7. Rampen management	2. Herstel van 5 ondiepe putten, boren van 2 diepe putten en de infrastructuur, bouw van 5 drinkbakken voor dieren, organisatie van 1 watermanagement training. 3. Distributie van voedselpakketten met pasta, suiker, rijst en melkpoeder. 6. Distributie van onderdak materiaal, 610 mensen hebben NFI gekregen. 7. Aan noodhulpproject is effectief leidinggegeven.	22.548
Stichting Vluchteling	4. Levensonderhoud	4. In totaal werden 28.996 dekens, 8.003 plastic zeilen, 6.400 keukensets, 28.906 slaapmatten en 9.703 jerrycans vervoerd naar Bossasso en gedistribueerd.	25.000

Wederopbouw in Somalië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	4. Levensonderhoud	4. Distributie van 10 boten, distributie van visgerei voor 185 vissers.	485
Oxfam Novib	4. Levensonderhoud 7. Rampen management	4. Betaling van alle werknemers. Herstel van 50 km weg tussen Bosasso en Bender Beyla. Het project had als onbedoeld effect van vredesopbouw tussen twee vechtende clans. Herstel van grote greppels, 11 kleine greppels, 3 kleine wegen en bouwen van dammen om erosie tegen te gaan. 7. Aan wederopbouwproject wordt effectief leidinggegeven en toezicht gehouden.	4.680

Noodhulp in Sri Lanka

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie en ICCO	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management	1. Traumacounseling aan slachtoffers gegeven, medische hulp geboden. Ondersteuning gegeven aan Ministerie van gezondheidszorg. 2. Waterpomp geplaatst. 3. Voedingshulp verstrekt, voedselopslagplaats gebouwd. 4. Goederen verstrekt, vrouwen kunnen weer produceren, generator geplaatst. Meubels verstrekt aan ontheemden centrum 5. Bouw van school, schoolbenodigdheden verstrekt. Schoolbegeleiding voor examenleerlingen, 28 studenten hebben studiebijlage voor 6 maanden gehad. Ze zetten hun studie door. 6. Constructie huizen. 7. Traumacounseling voor theologiestudenten. Training in traumacounseling voor leraren en vrijwilligers.	28.894
Mensen in Nood/ Cordaid	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen	1. 3.800 families hebben toegang tot basis gezondheidszorg en voorlichting gekregen, 138 vrouwen hebben speciale prenatale en postnatale zorg ontvangen. Families kunnen zich beschermen tegen malaria met muskietennetten. Families mentaal gesteund door 7 uitwisselingsprojecten en via een opgezet centrum met psychosociale voorzieningen voor een school. Basiskennis en bewustwording gerealiseerd tav milieuprobleem. Verdere behoeften beoordeling met een voorstel voor de volgende fase van steun voor management afvalverwerking. 2. 3.000 families hebben weer veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen door repareren en constructie van 48 toiletten en het repareren en schoonmaken van 620 bronnen in Batticaloa, 2 nieuwe putten gegraven, 4 beschadigde putten gerenoveerd en enkele putten zijn schoongemaakt in Mullativu; in Batticaloa zijn 18 putten schoongemaakt, 14 nieuwe putten gegraven en het water geanalyseerd in 3 ervan, 43 tijdelijke toiletten gebouwd in Mullativu en 18 permanente toiletten in Batti.	136.874

	<p>3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>3. 3.500 personen beschermd tegen ondervoeding.</p> <p>4. Diverse huishoudelijke artikelen, kleding en zeep gedistribueerd; 125 families in Mullativu, 275 in Batti en 500 in Ampara hebben geld ontvangen; bijdragen aan herstel van levensonderhoud van vissers door 6.600 visnetten en 4.652 kano's te produceren en distribueren; versterking van lokale visserij afdeling van het Ministerie en de vissersgemeenschap; 38 projecten zijn afgerond.</p> <p>5. 2.300 kinderen hebben educatie materialen ontvangen, 8 tijdelijke scholen gebouwd, training leraren.</p> <p>6. Distributie 593 tenten aan 583 families en 10 scholen; 629 tijdelijke onderkomens gebouwd.</p> <p>7. Veiligheids- en rampenmanagement systemen opgezet incl. 'district management information centrum' en informatie eenheden in het districts-secretariaat. Voor coördinatie van de activiteiten zijn er 3 kantoren opgezet in Galle, Matara en Kalutara. Dorpsontwikkelingscommissies gevormd in Mullativu, capaciteitsopbouw van 85 vrijwilligers, lokale leiders getraind, 2 trainingscursussen voor 80 leiders and 4 werkgroepen, workshop om participatie in besluitvormingsproces te bevorderen.</p>	
Nederlandse Rode Kruis	4. Levensonderhoud	<p>4. Directe nood aan 9.432 families in Galle, en 9.408 families in Hambantota geledigd door lokale aankoop en distributie van voedsel en hulpgoederen in samenwerking met de branches van het Sri Lankaanse Rode Kruis. Noodhulpprogramma is succesvol afgerond; Adequate sanitaire voorzieningen en distributie veilig drinkwater voor 35.000 mensen, voornamelijk in ontheemdenkampen; directe steun (voedsel en hulpgoederen) voor 200.000 mensen wier huizen zijn vernietigd en die hun bezittingen hebben verloren. 7.000 patiënten zijn behandeld in deels mobiele klinieken van het Rode Kruis. Onderdak en essentiële huishoud items zijn verstrekt aan 35.000 families (147.000 mensen); drinkwatervoorzieningen zijn geplaatst in 13 ontheemden kampen en drie ziekenhuizen, 150 waterputten zijn gereinigd; medische voorzieningen zijn verstrekt in het noordoosten; 10.000 mensen hebben gebruikt gemaakt van het tracing programma.</p>	79.100
Oxfam Novib	2. Water en sanitaire voorzieningen	2. Veilig drinkwater bij de huizen door schoonmaak bronnen volgens het WHO model, paar latrines gebouwd.	134.653

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Ontheemde gezinnen ontvingen voedsel tot dat overheidsrantsoenen arriveerde. 4. Ontheemden ontvingen huishoudelijke artikelen, zodat zij eigen maaltijden konden koken, slapen op matrassen. 5. Kinderen weer in staat om terug te keren naar school. 8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en monitoring 	
Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Alle noodhulpgoederen zijn getransporteerd en aangekomen op de plaats van bestemming. Essentiële goederen zijn verdeeld onder de slachtoffers. 	122.477
TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Voorzien in drinkwater door waterpompen te leveren. 3. Voorzien in voedsel door voedsel distributie. 4. Organisatie in de hoofdstad getraind in gebruik van microfinanciering, vissers zijn weer in staat hun werk te hervatten door boten en netten. 6. 180 families hebben tijdelijk onderdak door tenten. 	3.780
Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Slachtoffers hebben medische en traumazorg gekregen en zijn genezen. 2. Mensen hebben drinkwater gekregen. 3. Families hebben voedsel gekregen, baby's melk. 4. Huishoudelijke artikelen verspreid. 	10.300
UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lichamelijke en geestelijke gezondheid van getroffenen gestabiliseerd, o.a. door aanvoer van voldoende medicijnen voor 150.000 mensen voor 3 maanden. Niet-begeleide kinderen beschermd door identificatie en ondersteuning, pleeggezinnen gevonden, getraumatiseerde kinderen geholpen door psychosociale activiteiten. 2. Water en sanitaire voorzieningen verbeterd door toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en schone sanitaire voorzieningen, toegang tot 20l. zuiver drinkwater per dag voor 40% van de bevolking in opvangkampen, toegang tot 650 schoongemaakte bronnen en 422 geïnstalleerde waterplaatsen, toegang tot 1.150 nieuwe tijdelijke en permanente toiletten in kampen, scholen en dorpen, nieuwe badgelegenheden beschikbaar. 5. Onderwijs aan 80% van overlevende, schoolgaande kinderen hervat, o.a. door opzetten van 	600.000 (via internationale koepel)

	6. Huisvesting	3.209 noodscholen, meer dan 170 scholen schoongemaakt en noodscholen afgerond, schoolmeubilair, onderwijsmaterialen en recreatiesets gedistribueerd. 6. Voorziening van tijdelijk houten onderdak.	
Gastorganisatie			
Hivos	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management	1. Voorzien in counseling in 12 medische klinieken in drie districten, 654 counseling sessies in 2 districten (Matara-Galle), 46 religieuze activiteiten in 4 districten. 3. Voorzien in voedselhulp aan getroffen mensen in Matara, Hamanantota, Galle, Negombo, Kalutara & Ampara & 2500 mensen werden voorzien van lunchpakketten in twee districten. 5. 7.097 kinderen in 6 districten werden voorzien in bibliotheekboeken, bonnen voor schoenen, sport artikelen. 6. 9 tijdelijke huizen gebouwd en constructiemateriaal geleverd. 7. Vissers (mannen en vrouwen) hebben deelgenomen in workshops. 8. Effectieve levering van noodhulpmateriaal, coördinatie en efficiëntie.	20.000
Plan Nederland	1. Gezondheidszorg 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 8. Programma management	1. Uitbraak van besmettelijke ziekte voorkomen door medicijnen en medische voorraad aan gezondheidsautoriteiten te leveren voor gebruik in de noodkampen, goede gezondheidssituatie behouden door medische middelen te verschaffen aan Tangalle en medicijnen aan Hambantota ziekenhuis. 4. 1.000 jongeren voorzien van gereedschap (met-selarij, timmergereedschap). Twee MFI's hebben fondsen gekregen waar door getroffen vrouwen en hun gezinnen in staat zijn om kleine ondernemingen opnieuw op te starten. Bredere toegang tot diverse financiële diensten. 5. Schoolmateriaal, uniformen en schoeisel uitgedeeld aan 83.000 schoolgaande jongens en meisjes. 8. Uitvoering, toezichthouden en evaluatie capaciteit door nieuwe staf aan te nemen en aan het werk zetten.	208.148
World Vision	6. Huisvesting	6. 300 huishoudens zijn in staat geweest om tijdelijke huisvesting te vinden door de bouw van 300 semi permanente huizen.	1.500

Wederopbouw in Sri Lanka

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management	1. Mobiele klinieken georganiseerd, patiënten verwezen naar ziekenhuis, bijeenkomsten gezondheid- en voedingsvoorlichting georganiseerd o.a. op scholen; traumacounseling verleend. Medische hulp verstrekt, voedingshulp verstrekt aan zwangere vrouwen en kinderen. 2. Waterput en toiletten gebouwd. 4. Slachtoffers in contact gebracht met organisaties die netten verstrekken en boten en motoren repareren, cursussen kokosvezelproducten vervaardigen en naaicursussen. uitgevoerd, straattheater voor vrouwen, ondernemerscursus voor vrouwen, training beroepskeuze en carrièreperspectieven gegeven. Productiematerialen verstrekt voor landbouw, winkeliers ondersteund. Verbetering van de keuken van een opvangcentrum, generator geplaatst. Startkapitaal voor inkomensherstel uitgegeven, vissersboten en vistuig uitgegeven, 2 families ontvingen brommertaxi, 1 bedrijfsadviseur ingehuurd om bedrijfsontwikkeling te ondersteunen, trainingen te geven en trainees te adviseren op bedrijfsontwikkeling. 5. Schooluniformen, schoenen en schoolmateriaal verstrekt, sport en culturele activiteiten georganiseerd om kinderen te stimuleren naar school te gaan, kleuterschool gebouwd, 4 centra voor beroepstrainingen zijn gereed, 6 cursussen begonnen, timmerwerkplaats, elektrische kabels trekken, bouwnijverheid, reparatie motorboten, 23 mensen op gender ongelijkheid getraind; 5 trainingen 'empowerment' voor vrouwen. 6. Tijdelijke behuizing geconstrueerd, grond en eigendomsrechten voor huizen verkregen. Start huizenbouw. Huizen hersteld; 8 permanente huizen gebouwd; 35 metselaars geselecteerd en getraind. 7. Promotie voor participatie van de bevolking bij rehabilitatie dmv straattheater, cursus aan veldwerkers gegeven in pleitbezorging.	20.380

<p>Mensen in Nood/ Cordaid</p>	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p> <p>8. Rampen management</p>	<p>1. In staat slachtoffers te identificeren en hulp te verlenen in de dorpen door lokale trainers, centra voor trainingen en informatie.</p> <p>6. Voorzien in permanente behuizing door lokaal kantoortje, lokaal team en land voor 100 huizen. Alle bouwmaterialen zijn aangeleverd en opgeslagen. 15 huizen zijn volledig klaar, 85 huizen verkeren in diverse bouwstadia, maar zullen eind mei 2006 klaar zijn, 27 huizen en 16 toiletten zijn klaar; 4 huizen eind mei 2006. Start met bouw van 50 huizen vanaf mei 2006, 400 huizen zijn in diverse bouwstadia.</p> <p>7. Aanschaf van een ambulance, het verbeteren en uitbreiden van de capaciteiten op lokaal niveau op het gebied van rampenplannen.</p> <p>8. Ondersteuning van partners voor programma's en rapportage.</p>	<p>5.976</p>
<p>Nederlandse Rode Kruis</p>	<p>4. Levensonderhoud</p> <p>6. Huisvesting</p>	<p>4. 6 boten, 19 motoren en 1.636 netten voor visser in Bata-Atha zijn overgedragen en 14 boten, 1 kano en 264 netten voor Gurupokuna zijn aangekocht. Project afgerond: 60 touwmaakmachines (spinnewielen) zijn geleverd, evenals 8.000 kilo grondstoffen. Groentekwekers zijn getraind en hebben zaden, (kunst)mest en andere benodigdheden gekregen om groenten te kunnen verbouwen evenals beginkapitaal vooral om de grond 'plantrijp' te maken. Business-training en begeleiding zijn gegeven. Eerste oogst is binnen, laatste betalingen worden uitgevoerd in april, evaluatie wordt voorbereid; Tijdelijke vismarkt is gebouwd met 50 visstalletjes. Discussies gaande over huurvoorwaarden om te zorgen dat de huur voor de winkeliers haalbaar is, 3 bijeenkomsten met lokale gemeenschap gehouden om markt onderzoek te doen en over producten te discussiëren. Verschillende workshops gehouden, 5 driewieler taxi's aangekocht, geregistreerd en verzekerd. Overdracht heeft plaatsgevonden.</p> <p>6. Aannemer start met de reconstructie van 16 huizen in Hambantota en Galle in februari, van project voor herbouw huizen van 300 families is het eerste onderzoek afgerond. In Ampara District wordt grond bouwrijp gemaakt door vrouwen uit de dorpen. Ruwbouw van 51 huizen in Matara District is klaar, verwachte oplevering is half juni. Aannemer is geselecteerd voor tweede stuk land.</p>	<p>3.393 (via internationale koepel)</p>

	7. Rampen management	7. Workshops gegeven in het verlenen van noodhulp. Rode Kruis staf en vrijwilligers getraind in beoordeling van lokale capaciteit en kwetsbaarheid op gemeenschapsniveau, 2 introductiecurssussen voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd. On the job training, met name voor financieel personeel.	
Oxfam Novib	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management	1. Capaciteit vergroot van schoolhoofden en staf van lokale NGO staf en overheid om psychosociale symptomen te herkennen en adequate hulp te geven. Toename in gevoel van zelfverzekerdheid, waardigheid en vertrouwen bij tsunami getroffen kinderen en vrouwen. Levensonderhoud diensten in samenwerking met psychosociale diensten hebben mensen terug naar de normaliteit van de dag gebracht, 7 schooluitvallers zijn terug naar school na gesprekken met lokale NGO. 2. Constructie van drinkwateraansluitingen voor 50 huizen heeft de toegang tot veilig drinkwater verbeterd. 4. Distributie van gebruiksvoorwerpen, middelen en klein startkapitaal voor mensen om inkomensherstellende activiteiten te starten, capaciteitsopbouw voor getroffen. Verbeterde kwaliteit van producten, bijvoorbeeld door koeltanks om vis in op te slaan. 5. Kinderen in staat gesteld terug te keren naar school. 6. 120 gezinnen wonen (weer) in een veilige woning. 7. Milieu en socio-economische onderzoek. 21 kleine projecten ter versterking van de kust, beleid en pleitbezorging. Restoratie van zandduinen, vergroten van het bewustzijn en excursies over kustbescherming en het belang van een schone en gezonde kuststrook. 8. Oxfam Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en monitoring.	159.727
Stichting Vluchteling	1. Gezondheidszorg	1. 12 artsen zijn voldoende getraind om psychisch zieke patiënten te behandelen. Hiervan hebben 8 artsen een specialisatiegraad behaald en zijn bevoegd om collega's te trainen; 158 gezondheidszorgwerkers zijn getraind door bovengenoemde artsen, bouw van een kliniek in Ampara district is gestart, 35 directeuren en 79 leerkrachten van 30 scholen zijn psychosociaal getraind. Getrainde leraren trainen hun collega's,	60.833

	5. Onderwijs 6. Huisvesting	centra gebouwd, inkomensgenererende goederen van 256 vrouwen vervangen. 5. 2 ECE centra geopend. 6. 612 huizen overgedragen, 1 weeshuis geopend met 40 kinderen.	
UNICEF	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs	1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomen door vaccinaties en verstrekken van Vitamine A, niet-begeleide kinderen beschermd door identificatie en ondersteuning, bouw van medische centra/ ziekenhuizen zijn in uitvoering. Psychosociale hulp plan opgezet en in werking, verlenen van steun aan kinderen die hun ouders hebben verloren en uit een ouder gezinnen, jeugdwetgeving in voorbereiding; kinderen ontwormd en voorzien van micronutriënten, nieuwe noodpakketten. 2. Toegang tot zuiver water in terugkeer woonplaats nog in uitvoering; 4.400 tijdelijke en permanente toiletten gebouwd in doorgangskampen, scholen, gezondheidscentra en dorpen. Toegang tot nog eens 6.300 waterplaatsen en 1.600 badgelegenheden zijn in uitvoering. 5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolstelsel incl. schoolmaterialen en training onderwijzers; Onderwijs van 20% van overlevende, schoolgaande kinderen hervat; Scholen ingericht met materialen, waaronder 7.000 stoelen en 3.000 banken; Vrijtijdsartikelen voor schoolgaande kinderen; Materiaal voor 120.000 schooluniformen geleverd.	830.150 (via internationale koepel)
Gastorganisatie			
CARE Nederland	1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud	1. Bijdrage geleverd aan het verbeteren van de psychosociale situatie van getroffen huishoudens door opnieuw toegang te krijgen tot radio programma's waaronder nieuws en amusement. 2. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeterd door de bouw van 45 putten, 107 begunstigden waren getraind in hygiënebevordering. 4. Herstel van levensonderhoud voor vissers door 15 boten, 17 kano's en 172 visnetten te verspreiden, agrarische middelen verspreid, 27 waterpompen, 333 huishoudens leningen gegeven voor landbouwactiviteiten, 2 naaimachines en accessoires gegeven, donaties voor agrarische activiteiten en voor kleine ondernemersontwikkeling, 72 begunstigden hebben training	4.150 (via internationale koepel)

	6. Huisvesting	<p>gekregen in het fokken van dieren, 32 mensen hebben een timmerworkshop gedaan.</p> <p>6. 291 tijdelijke woningen gebouwd en bewoond in Trincomalee. Bouw van permanente woningen is gestart, ontruiming van grond en planning is voltooid, van 20 permanente huizen is de fundering aangebracht, 49 tijdelijke woningen gebouwd en 101 in aanbouw in Batticaloa.</p>	
Family Help Programme	<p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>8. Rampen management</p>	<p>2. 16 bewoners voorzien van water en sanitaire voorzieningen.</p> <p>4. 51 vissers zijn in staat om in hun levensbehoefte te voorzien.</p> <p>6. 3 huizen zijn gebouwd, 2 ha land aangekocht, andere aankopen zijn gepland en bouw van 67 huizen staan op de planning.</p> <p>8. Projectcoördinator, projectdirecteur en bouwopzichter aanstellen.</p>	723
Hivos	<p>4. Levensonderhoud</p> <p>7. Rampen management</p> <p>8. Programma management</p>	<p>4. Bijdrage aan het herstellen van levensonderhoud van vissersgemeenschappen door 400 boten, 100 motoren te repareren en 53 nieuwe boten zijn gebouwd.</p> <p>7. Toename van de lokale capaciteit door vissersmannen en -vrouwen deel te laten nemen in workshops, training en lobbyactiviteiten, 3 plantenkwekerijen, 250 planten geplant, 22 lokale gemeenschappen ingezet voor deze activiteiten. Lokale organisaties die post-tsunami projecten uitvoeren worden ondersteund in hun monitoring en rapportagesystemen.</p> <p>8. Effectieve levering van noodhulp materiaal, coördinatie en efficiëntie.</p>	13.500
Habitat for Humanity	6. Huisvesting	6. 40 huizen gebouwd en al bewoond op drie bouwterreinen, 23 huizen zijn in verschillende bouwfases op drie bouwterreinen.	168
Plan Nederland	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>4. Levensonderhoud</p>	<p>1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomen door handhaven van medicijnen en medische voorraad voor Ministerie van Gezondheid en staatsfarmacie voor kinderen en volwassenen, hierdoor goede en kwalitatieve gezondheidssituatie behouden, stress en psychosociale impact van de tsunami is verminderd waardoor een normaal leven min of meer is behouden. Ondervoeding voorkomen door oorzaak te achterhalen.</p> <p>4. Toegenomen inkomen en werkgelegenheidskansen door basis- en beroepstraining.</p>	2.170.898

	<p>5. Onderwijs</p> <p>6. Huisvesting</p> <p>8. Programma management</p>	<p>147 trainees toegelaten tot eerste training. 90% heeft cursus afgerond en baan gevonden. 1.000 jongeren getraind als loodgieter, electricien, timmerman en metselaar.</p> <p>5. Kinderen keren terug in een normaal schoolritme omdat zij toegang hebben tot tijdelijke klaslokalen, terwijl beschadigde scholen worden herbouwd en gerepareerd. Leraren en begeleiders zijn getraind in traumacounseling. door creatieve methoden keren kinderen omgaan met stress. Er is radio-onderwijs.</p> <p>6. Bijdrage aan veilige en kindvriendelijke woonomgeving voor 200 gezinnen; 150 families zijn in staat om nieuwe huizen van hun wens te bewonen; 111 families voeren de bouw van een nieuw huis uit door afbetaling. Toegenomen begrip van het belang van kinderbescherming op alle betrokken niveaus</p> <p>8. Nieuwe lokale en internationale staf aangenomen waardoor de capaciteit van uitvoering, monitoring en evaluatie is toegenomen</p>	
World Vision	<p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p>	<p>4. 1.500 mensen hebben toegang tot semi-permanente huizen, 9 vissers opslagruimtes, 3 markten.</p> <p>5. 17 semi-permanente leeskamers voor kinderen gebouwd, kinderen in 9 gemeenschappen gaan naar kleuteractiviteiten in semi-permanente scholen.</p>	1.500
ZOA Vluchte- lingenzorg	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>2. Water & sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>6 Huisvesting</p> <p>7. Rampen management</p>	<p>1. Hygiëne en gezondheidsbewustzijn programma's in 35 dorpen uitgevoerd, 10 workshops gehouden, psychosociale steun door bewustzijn programma's die in 36 dorpen worden uitgevoerd, 10 workshops, 903 familie bezoeken uitgevoerd.</p> <p>2. 2 nieuwe putten en 9 toiletten gebouwd.</p> <p>4. 89 inkomensgenererende pakketten verspreid, 1 bedrijfstraining uitgevoerd.</p> <p>5. 1 school gerepareerd, 3 scholen hebben materiaal ontvangen.</p> <p>6 73 huizen gebouwd, ontruiming van bouwgrond, ontwerp en bouw van toegang en binnenwegen, ontwerp en bouw van drainagesystemen, dorpsontwerp en goedkeuring van terrein ontwikkelingsplannen, 8 gebieden hebben permanente huizen.</p> <p>7. 13 CBO's hebben ondersteuning in de vorm van materiaal, meubels en training gekregen.</p>	79.800

Noodhulp in Thailand

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Oxfam Novib	6. Gezondheidszorg 2. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 7. Rampen management	1. Medische hulp verleend aan 68 mensen, 43 religieuze ceremonies georganiseerd voor 3.000 migranten, 10 maatschappelijk werkers getraind in gezondheidszorg. 2. 7.207 mensen ontvingen voedselhulp in 11 districten. 4. 273 migranten geholpen bij het verkrijgen van tijdelijke arbeidsvergunningen (33% vrouwen). 7. Aantal overleden en vermiste migranten in kaart gebracht, traumacounseling voor 7 families, waarvan een ouder is overleden, 2 wederopbouwcentra opgericht.	10.558

Wederopbouw in Thailand

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	1. Gezondheidszorg 4. Levensonderhoud 7. Rampen management	1. Materialen bij psychosociaal ondersteuningsprogramma verstrekt, speciale aandacht voor direct door de tsunami getroffen kinderen. Speciale aandacht voor door HIV/Aids getroffen families, praatgroepen voor HIV/Aids geïnfecteerden georganiseerd. 4. Inkomensgenererende activiteiten voor getroffen families. 7. Training jongeren, die psychosociaal ondersteuningsprogramma voor jonge tsunami slachtoffers gaan begeleiden.	238
Oxfam Novib	1. Gezondheidszorg	1. 673 patiënten hadden toegang tot medische zorg en ziekenhuis, 250 monniken namen deel aan religieuze ceremonies om de doden en vermiste personen te herdenken. Van 4.760 migranten is het bewustzijn over veilig vrijen en HIV/Aids	15.475

	<p>2. Water en sanitaire voorzieningen</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p> <p>8. Programma management</p>	<p>toegenomen, 18 migranten werkers zijn bezocht door gezondheidsteam. Van 1.110 migranten is het begrip van vogelgriep, HIV/Aids toegenomen, bij 238 vrouwen is het bewustzijn over reproductieve gezondheidszorg en andere familiekwetsies toegenomen. Internationale kinderdag is gevierd met 350 migrantenkinderen van tsunami getroffen gezinnen, 350 radio's verspreid.</p> <p>2. 76 toiletten gebouwd voor 20 gemeenschappen (4.000 migranten), 10 waterputten (1.100 migranten).</p> <p>4. Stafleden en vrijwilligers zijn getraind in arbeidsrecht en beleid en werkvergunningen. 300 migranten hebben informatie aangevraagd over het nieuwe registratiebeleid, 298 werknemers hebben juridische steun gekregen bij arbeidsproblemen, 86 vrouwen woonden bijeenkomst arbeidsrecht en geweld op de werkvloer bij, 15 migranten werknemersplaatsen bezocht om het nieuwe registratiebeleid te vertellen. 47 migranten verzekerd van een registratiekaart, vrijlating en vrij spraak van 5 zogenaamde migrantexploitanten (nu worden ze uitgezet).</p> <p>5. 27 kinderen hebben een geboortebewijs gekregen waardoor zij toegang hebben tot onderwijs, Door de interventie van lokale NGO is een systeem opgericht zodat migranten zelf hun geboortecertificaat kunnen vervaardigen, een gemeenschapsonderzoeksbureau met een kleine bibliotheek is op gezet met Birmese boeken.</p> <p>8. Een projectkantoor is in Phang Nga provincie opgezet.</p>	
Terre des Hommes	<p>1. Gezondheidszorg</p> <p>4. Levensonderhoud</p> <p>5. Onderwijs</p>	<p>1. 1 coördinatie- en informatiecentrum is operationeel (1 inmiddels gesloten), vrouwen en kinderen hebben hun trauma verwerkt.</p> <p>4. 52 vrouwelijke kostwinnaars leiden een winstgevend klein bedrijf.</p> <p>5. Psychosociale onderwijsactiviteiten georganiseerd zodat getraumatiseerde kinderen hun onderwijs weer kunnen hervatten.</p>	1.170

Bij de weergave van de bereikte resultaten in de hulpverlening in de getroffen landen moeten enkele kanttekeningen geplaatst te worden:

- In deze bijlage worden uitsluitend die activiteiten genoemd die zijn afgerond. Geplande activiteiten zijn niet opgenomen in het schema. Een volledig overzicht van in uitvoering zijnde en geplande activiteiten per organisatie is te vinden in de deelrapportages, die op te vragen zijn bij de SHO.
- Verschillende organisaties zijn onderdeel van een internationale koepelorganisatie. Dit betekent dat vaak gezamenlijk met de internationale koepel een programma wordt opgezet, waar de lidorganisaties van de koepel hun bijdrage aan leveren. De meeste SHO-organisaties waren in staat om weer te geven hoe de Nederlandse bijdrage is besteed. Een uitzondering hierop vormden het Nederlandse Rode Kruis en UNICEF Nederland.
- In deze rapportage worden de resultaten van de gehele operatie van het Internationale Rode Kruis (IFRC of ICRC) in Sri Lanka en Indonesië weergegeven, in plaats van de resultaten die bereikt zijn met alleen de SHO-middelen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft bijgedragen met financiële middelen, hulpverleners en hulpgoederen. De verantwoording voor de besteding van die middelen ligt bij de IFRC of ICRC. Omdat niet (altijd) te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp specifiek van het Nederlandse Rode Kruis afkomstig is, worden in deze rapportage de resultaten en het aantal beneficianten van de gehele operaties van de ICRC en IFRC in Sri Lanka en Indonesië weergegeven. De operaties tijdens de noodhulpfase omvatten meerdere sectoren, maar worden in onderstaande tabel samengevat in één sector, te weten Levensonderhoud. De bereikte doelgroep is alleen van het Nederlandse Rode Kruis weergegeven.
- Unicef Nederland draagt alle via de SHO verkregen gelden af aan het hoofdkantoor van Unicef in New York. Het hoofdkantoor bundelt de wereldwijd ingezamelde fondsen, gaat committeringen aan en verdeelt het geld op basis van projectaanvragen uit de landen zelf. De verantwoording voor de besteding van die middelen ligt bij Unicef New York. Omdat niet te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp specifiek van Unicef Nederland afkomstig is, worden in deze rapportage méér resultaten en beneficianten weergegeven dan enkel met SHO-fondsen zijn bereikt.
- De resultaten die voor CARE Nederland zijn weergegeven zijn behaald met de bijdrage van de SHO en andere middelen. Op dit moment beschikt CARE Nederland niet over de informatie welke onderdelen exclusief met SHO tsunami fondsen zijn bekostigd.
- ZOA Vluchtelingenzorg heeft de SHO gelden toegekend gekregen voor wederopbouwactiviteiten die in 2006 van start gaan.
- Er zijn schattingen gemaakt van de bereikte doelgroep. Per activiteit kan betrekkelijk nauwkeurig geschat worden hoeveel mensen er bereikt zijn, maar met het optellen van de doelgroepen van verschillende activiteiten is het mogelijk dat eenzelfde persoon van verschillende vormen van hulp gebruik heeft gemaakt van één organisatie. Ook kan het voorkomen dat één persoon van verschillende SHO-lid-organisaties hulp ontvangt.

Bijlage 4

Gefinancierde Nederlandse Project partnerorganisaties

SHO-lidorganisatie & gastorganisatie	Nederlandse project partners
Mensen in Nood/Cordaid	Boot voor Boot Actie voor Zuster Madeleine Stichting Nedsom VSO medische ass. Stichting Waterhelp Aqua4all Centrum geweldloze communicatie Stichting World Partners Stichting Kerala Ondersteuning hulp Sri Lanka SVHO: Stichting Vrijwillig Samenwerkende Hulporganisatie Ontwikkelingslanden) Melania Unie van Soroptimisten Lions werkgroep Indonesië Rotary Amsterdam Landsmeer Lions Naarden Bussum SUM (stichting Udenhout Mondiaal) Marco Polo Cycling Club Lionsclub Zevenhuizen Stichting Isai Ma(I)Yam Stichting Medi-aid Holland Sri Horizon Holland-Medemens in actie Stichting Raja Sri Lanka Waste Miva (Missie vervoersmiddelen actie) KNCV Tuberculose fonds Stichting Motherhood Mama Cash CMC (Centraal Missie Commissariaat) ICET (International centre for emergency techniques)
Kerkinactie	ADRA –Adventist Development and Relief Agency (Nederland) AMRA Aceh Media Reconstruction Assistance – Free Voice BBO – Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking Dorcas Hulp Nederland Hivos/ WUSC – World University Services of Canada Kleine initiatieven – Petra Groot Enzerink Leger des Heils Nederland Stichting Howu-Howu Stichting Lampuuk Atjeh (Leusden) Stichting Wederopbouw Atjeh (SWA)

	<p>Stichting Red een Kind Stichting Edukans (tbv Church of South India Synod) Stichting Woord en Daad YMCA Nederland</p>
Nederlandse Rode Kruis	<p>KNCV Tuberculosefonds Solid House Foundation</p>
Oxfam Novib	<p>Chance4all Hivos FNV Mondiaal Lilliane Fonds Pintu Aceh Schone Kleren Kampagne Stichting Anak Asuh Batam Wetlands International/Wereld Natuur Fonds/ The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)</p>
TEAR fund	<p>ZOA Vluchtelingen zorg Woord en Daad</p>
Plan Nederland	<p>Faculteit van Psychiatrie en Neuropsychiatrie van de Universiteit Maastricht Health Net International (HNI)/Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)</p>

Bijlage 5

Overzicht uitvoerende (lokale) organisaties

Land	SHO-lidorganisatie & gastdeelnemer	Uitvoerende organisatie
India	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • ACT-UELCI - United Evangelical Church in India • ACT-CASA Church's Auxiliary for Social Action • CCRD - Centre for Child Rights and Development • CSI - Church of South India • REDS - Rural Education and Development Society • SAVE - Social Awareness and Voluntary Education • VHAI - Voluntary Health Association of India • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
	Mensen in Nood/Cordaid	<ul style="list-style-type: none"> • WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association • UNNATI - Organisation for Development Education • CHAI - The Catholic Health Association of India • SED - Social Education for Development • RUC - Rural Uplift Centre • RUCODE - Rural Community Development of India • Kalvi Kendra • People Watch • TRRC (CEDA TRUST) - Tsunami Relief - Rehabilitation Coordination • KRRC - Kanniyakumari Rehabilitation Resource Centre • CCOORR - Christan Council for Rural development and Research • Caritas India • SAHAYI: Centre for Collective Learning and Action • KARANULAYA • ANKURAM Woman & Child Development Society • CATER TRUST • ASA-GV - Ahmedabad Study Action Group • DON BOSCO • CSR - Centre for Social Reconstruction • Caritas India • CEDA TRUST
	Oxfam Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU) • Development of Humane Action Foundation (DHAN) • New Entity for Social Action (NESA) • PREPARE • Society for Integrated Development in Urban Rural Area (SIDUR) • Society for Rural, Urban & Tribal Initiative (SRUTI)
	TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> • Eficor • Discipleship Centre

	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Brother Siga Social Services Guild (BSSSG) • Integrated Rural Development Centre (IRDC) • Shanthana Human Welfare & Educational Trust (SHWET) • New Life • Renaissance Trust • Social Unit for Community Health and Improvement (SUCHI) • Manush Kylasanahalli • Rural Organisations for Poverty Eradication Services (ROPES) • Rural Association for Integrated Development (RAID) • Rural Action in Development Society (RAIDS) • Rural Institute for Community Education (RICE)
	Hivos	<ul style="list-style-type: none"> • South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS) • Catalyst Management Services (CMS)
	Habitat for Humanity	<ul style="list-style-type: none"> • Rotary Club of Madras • United Evangelical Lutheran Church (UECLI)
	Save the Children	<ul style="list-style-type: none"> • Save the Children UK • Nature • Sravanti • Sardis • Help • Camel • Action
Indonesië	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • 4InDev • Atjehkita – Yayasan Atjehkita • ACT-CWS Church World Service Indonesia • ACT-YEU Yakkum Emergency Unit • ACT-YTB Yayasan Tangguh Bencana • AMRA Atjeh Media Reconstruction Assistance-Free Voice • BNKP-Banua Niha Keriso Protestan • Elsaka-Center for Study and Policy Advocacy (Banda Aceh en Nias) • Eye on Aceh • Flower of Aceh • ICW – Indonesia Corruption Watch • JKMA Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh • JKPP – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif • Koalisi NGO Ham • Kontras • KTP – Komunitas Tikar Pandan • NU – Nahdlatul Ulama Aceh • PAPAN – Yayasan Pembela Petani dan Nelayan • PASKA – Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh Pidie • PBHI – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia Indonesia • PBI – Peace Brigades International Indonesia Project • PCC- People Crisis Centre • Protestantse Kerk Nias (Pelmas BNKP – Banua Niha Keriso Protestan)

		<ul style="list-style-type: none"> • PULIH – Foundation for Trauma Recovery and Psychosocial Intervention • RATA Banda Atjeh • RPUK – Khairani an Rpuk • SHEEP – Society for Health Education through Empowerment Peace • SHMI – Suara Asasi Manusia di Indonesia • UCM – Urban Community Mission Jakarta • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children) • Yadesa – Human Rights & Community Mission Jakarta • YAKKUM Rehabilitation Centre • Yamajo – Yayasan Madani Foundation Jombang • YSKD – Yayasan Sinar Kasih Desa
	Mensen in Nood/Cordaid	<ul style="list-style-type: none"> • Cordaid Medan, Loksimatew, Sinabang • Perdhaki • PPKGO - Persatuan Petani Kopi Gayo Organik • CV Trimaju • Insist - Indonesian Society for Social Transformation • Aman - Asian Muslim Action Network/ Asian Resource Foundation (ARF)
	Nederlandse Rode Kruis	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesische Rode Kruis /Palang Merah Indonesia(PMI) • Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen (IFRC) • Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) • Stichting Howu-Howu • Soroptimist International Jakarta • Belgische Rode Kruis • Teachers Training College, South Nias, Teluk Dalam
	Oxfam Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK)
	Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> • UNHCR • International Rescue Committee / Consortium for Assistance to Refugees and the Displaced in Indonesia ((IRC/CARDI) • International Medical Corps (IMC)
	TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> • World Relief USA • TEAR fund UK • Yayasan Perisai Biru (YPB) • PELMAS
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Solidaritas Masyarakat (FOSOMA) • Solidaritas Korban Sunami (SKS) • Forum Bangun Aceh (FBA) • Yayasan KKSP • Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) • Helen Keller Foundation • Suara Hak Asasi Manusia di Jakarta(SHMI) • PCC • Forum LSM Aceh

		<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Solidaritas Sehat (YSS) • Yayasan Bumi Kita (YBK) • UNIMA • Masyarakat Pesisir Pantai (MAPAN) • Aceh Concern on Humanity (ACH) • Lamkoeta • Civil Solidarity of Aceh (CISA) • Yayasan udep Saree (YUS) • Badan Rehabilitasi Lingkungan Hidip Aceh (BARLINA) • LPAM-Nias
	Hivos	<ul style="list-style-type: none"> • Humanitarian Solidarity Coalition for the Natural Disaster (KSKBA) / Sintesa • Internews • Hivos Liason Office in Atjeh • Hivos/ German Agro Action
	Save the Children	<ul style="list-style-type: none"> • Save the Children US • Al Afghani • HMI • Rumohkipo • Malikusaleh University • Yayasan PULIH • Apokayan films • Ministerie van Onderwijs en Ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn
	SOS Kinderdorpen	<ul style="list-style-type: none"> • SOS Desa Taruna Indonesia • SOS Children's Villages International
	TNT/WFP	<ul style="list-style-type: none"> • United Nations World Food Programme, Italy
	World Vision	<ul style="list-style-type: none"> • World Vision Indonesia
Myanmar	Oxfam Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)
Somalië	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • EKD Germany Diakonie Emergency Aid (DBG (Daryeel Buisho Guud)
	Oxfam Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Galkayo Education Center for Peace and Development (GECPD) • Horn Relief (HR) • Ocean Training and Promotion (OTP)
	Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> • UNHCR

Sri Lanka	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • ACT NCCSL National Christain Council of Sri Lanka • ACT-CASA Church's Auxiliary for Social Action • Fridsro Disaster Relief Fund • LHDF - Lanka Help and Development • OfeRR - Organisation for Eelam Refugees Rehabilitation • PCA - Peace and Community Action • Siyath Foundation • SPCD – Society for people centered development • TCL - Theological. College of Lanka • WCC - Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
	Mensen in Nood/Cordaid	<ul style="list-style-type: none"> • Cordaid Sri Lanka • Sedec (Caritas Sri lanka) • FCE - Foundation for Co-existence • NAWF - National Anti War Front • SEED - Social Economical & Environmental Developers • HDO - Human Development Organisation • EHED - Eastern Human and Economic Development Centre Trinco • TDDA - Trincomalee District Development Association • Shantiham • SWEED - Social Welfare Economic and Environmental Developers • Weavers Ampara
	Nederlandse Rode Kruis	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Lankaanse Rode Kruis (SLRK) • Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen (IFRC) • Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)
	Oxfam Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) • Consortium of Humanitarian Agencies (CHA) • International War-Related Trauma and Humanitarian Intervention Trust (IWTHI) • Sarvodaya Economic Enterprise Development Services (SEEDS)
	Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> • UNHCR • International Medical Corps (IMC) • Mines Advisory Group (MAG) • Home for Human rights / Advocacy Project (HRR/AP) • Norwegian Refugee Council (NRC) • Norwegian Refugee Council / Consortium for Assistance to Refugee and the Displaced in Indonesie (NRC/CARDI)
	TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> • Strömme Foundation • LEADS
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Small Fishers Federation Lanka (SFLL) • Makandura Children's Village • Mentally Handicapped Children & Families Educational Project (MENCAFEP) • Jeeva Jothy

	CARE Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • CARE Sri Lanka
	Family Help Programme	<ul style="list-style-type: none"> • Family Help Programme Sri Lanka
	Hivos	<ul style="list-style-type: none"> • National Fisheries Solidarity (NAFSO) • Centre for Development Initiatives (CENDI)
	Plan Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Sri Lanka
	World Vision	<ul style="list-style-type: none"> • World Vision Lanka
	ZOA Vluchtelingen zorg	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasakthi Foundation • Rural Economic Development Society (REDS) • Women's Development Centre Akkaraippattu (WDC) • SESSO • Foundation for Co-Existence (FCE) • ITDG • PWA • Thagadam & Al-Insanya • Shadow • Non-Violent-Peace-Force • Kilinochchi Association for Rehabilitation of the Disabled (KAROD) • Church of South India (CSI) • Punarai Development and Rehabilitation Organisation (PDRO) • Patchali Pallai Development Rehabilitation Organisation (PPDRO) • North East Development Rehabilitation Organisation (NEDRO) • Familian Psycho-social Rehabilitation Centre
Thailand	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • ACT-CCT – Action by Churches Together - Church of Christ in Thailand • CCT – Church of Christ in Thailand • Siam Care • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
	Oxfam Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Tsunami Action Group (TAG) • Migrant Action Programme (MAP)
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Foundation for Women (FFW)

Bijlage 6

Profielen SHO-lidorganisaties

Kerkinactie maakt het geloof van leden van de Protestantse Kerk in Nederland en tien andere kerkgenootschappen concreet. Kerkinactie steunt wereldwijd het werk van christelijke kerken en organisaties. Kerkinactie geeft noodhulp en draagt structureel bij om mensen tot hun recht te laten komen, ongeacht geloof, nationaliteit, ras of sekse. Kerkinactie heeft een gezamenlijk noodhulpprogramma met de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie ICCO, partner van ondernemende mensen.

Mensen in Nood/Cordaid helpt slachtoffers van natuurrampen, oorlog of armoede. Mensen in Nood richt zich op noodhulp en bouwt samen met de getroffen bevolking zo snel mogelijk hun leven weer op. Mensen in Nood werkt altijd samen met lokale partnerorganisaties. Veerkracht en motivatie van de getroffen is het uitgangspunt voor een betere toekomst: hen helpen zichzelf te helpen. Mensen in Nood maakt samen met Vastenactie, Memisa en Kinderstem deel uit van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Het Nederlandse Rode Kruis werkt op veel plekken in de wereld om slachtoffers van rampen bij te staan. Snel ter plekke met noodhulp, nauwkeurig in de wederopbouw. Het Nederlandse Rode Kruis werkt altijd samen met haar lokale zusterorganisaties en betreft de bevolking intensief bij de hulpverlening. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Oxfam Novib Wereldwijd strijden mensen voor hun recht op een fatsoenlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, een veilig leven en een eigen identiteit. Oxfam Novib steunt hen daarbij. We steunen partnerorganisaties, en voeren campagne voor een rechtvaardig beleid. Lokaal en internationaal, want armoede en onrecht zijn wereldwijde problemen en hebben te maken met onrechtvaardige economische en politieke verhoudingen.

Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Stichting Vluchteling biedt vluchtelingen een menswaardig, zelfstandig bestaan met structurele hulp op het terrein van onderwijs, vakopleidingen, medische zorg en werk.

TEAR fund is een christelijke ontwikkelingsorganisatie en verleent via haar (christelijke) partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika integrale hulp aan mensen in nood. Deze ontvangen via TEAR fund niet alleen fysieke en materiële hulp, maar ook psychische en sociale begeleiding. TEAR fund richt zich op kinderen, volwassenen en de lokale gemeenschappen. Zij maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

Terre des Hommes komt op voor de rechten van het kind en probeert wereldwijd regeringen te dwingen zich aan die rechten te houden. Terre des Hommes biedt kinderen, ongeacht geloof, ras of politieke overtuiging, ook een alternatief door middel van structurele projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en zelfstandigheid.

Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en verbetert in 161 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen. Unicef Nederland geeft voorlichting over en werft fondsen voor het werk van Unicef internationaal en lobbyt voor naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Bijlage 7

Profielen gastdeelnemers

CARE Nederland streeft naar een wereld waar mensen in veiligheid, waardigheid en duurzame vrede kunnen leven. We geloven in het vermogen van slachtoffers van rampen om hun ellende te overwinnen. CARE Nederland helpt slachtoffers van natuurrampen en oorlogen bij het herstellen van hun bestaanszekerheid en bij het vinden van oplossingen die hen minder kwetsbaar maken voor nieuwe rampen.

Family Help Programme Holland-Sri Lanka richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten in de Sri Lankaanse maatschappij en stelt zich daarbij nadrukkelijk tot doel, daar waar mogelijk, de zelfstandigheid van mensen te vergroten, hun ontwikkelingsmogelijkheden te verbeteren en zo bij te dragen aan de mogelijkheid van mensen om zelf vorm te geven aan hun toekomst.

Habitat for Humanity is een internationale hulporganisatie die ernaar streeft de armoedebehuizing de wereld uit te helpen. Habitat doet dit door samen met voormalige krotbewoners een veilig en degelijk huis te bouwen. Stichting Habitat for Humanity Nederland is sinds 1993 actief.

Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst.

Plan Nederland werkt voor kinderen. Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 45 landen. Plan zet zich in voor een betere naleving van het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Save the Children werkt aan blijvende verbeteringen in de levens van kinderen wereldwijd. Na de tsunami is Save the Children ter plaatse direct gestart met het verlenen van hulp aan kinderen en hun leefomgeving. Save the Children Nederland maakt onderdeel uit van de International Save the Children Alliance, die met 27 onafhankelijke lidorganisaties actief is in meer dan 100 landen.

SOS-Kinderdorpen vangt wereldwijd weeskinderen op in speciaal voor hen gebouwde kinderdorpen in een natuurlijke gezinssituatie. Zij worden liefdevol opgevoed door een SOS-moeder in een huis waar ze samen met broertjes en zusjes opgroeien. In de SOS-kinderdorpen zijn ook scholen en medische en sociale centra die tevens toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap.

World Vision werkt aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in een veilige en rechtvaardige omgeving zodat ieder kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal kan ontwikkelen. We zijn christelijk geïnspireerd en helpen kinderen en hun families zonder onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging.

ZOA-Vluchtelingenzorg is een internationale christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie. ZOA verleent wereldwijd hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Hulp wordt gegeven ongeacht religie, sekse of afkomst.

Bijlage 8

Adres en contactpersonen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen naar het actiesecretariaat:

SHO/actiesecretariaat
Kerkinactie
030 800 05 55
info@giro555.nl

Voor persinformatie over de SHO kunt u contact opnemen met Wim Brouwer: 030 8801786 - 06 23538716.

Voor informatie over de specifieke hulpactiviteiten per SHO-organisatie kunt u contact opnemen met:

SHO-organisaties:

Kerkinactie	Wim Brouwer	030 8801786	06 23538716
Oxfam Novib	Paul van Tongeren	070 3421644	06 51573683
Mensen in Nood / Cordaid	Marjolein Hammink	070 3136270	06 22524028
Nederlandse Rode Kruis	Anna Kodde	070 4455852	06 20959478
Stichting Vluchteling	Tirsa Hofstee	070 3468946	06 25188634
TEAR fund	Suzanne Vermeulen	0343 514844	06 41889255
Terre des Hommes	Esther Adam	070 3105000	06 20499295
Unicef	Martin de Beer	070 3339379	06 14799599

Gastdeelnemers:

CARE Nederland	Camille Fontyn	070 3105050	
Habitat	Paul Koets	023 5474814	06 51409695
Hivos	Francis Beelaerts van Blokland	070 3765534	
Plan Nederland	Danielle Friskes	020 5495335	06 48420258
ZOA vluchtelingenzorg	Otto Kamsteeg	055 3663339	06 19260418
Save the Children	Inez de Graauw	070 3384448	06 38535977
SOS kinderdorpen	Marjolein Lankhout	020 4080190	
World Vision	Anthea van der Berg	033 4643444	
Family Help Programme	Jacqueline Blokhuis	053 4757473	06 51277832

Colofon

Uitgave van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

© Utrecht, juni 2006.

Drukwerk en lay-out: www.libertas.nl.

Teksten: Samenwerkende Hulporganisaties, Helene Pulles.

Drukwerkbegeleiding: Rose-Leah Windster-Trapenberg (Protestantse Kerk).

Redactie: Toos Bierhoff (Bureau Inter-Ludium).

Eindredactie: Jaap 't Gilde (Kerkinactie en ICCO) voor de SHO.

SHO-lidorganisaties



Gastdeelnemers



tsunami
